
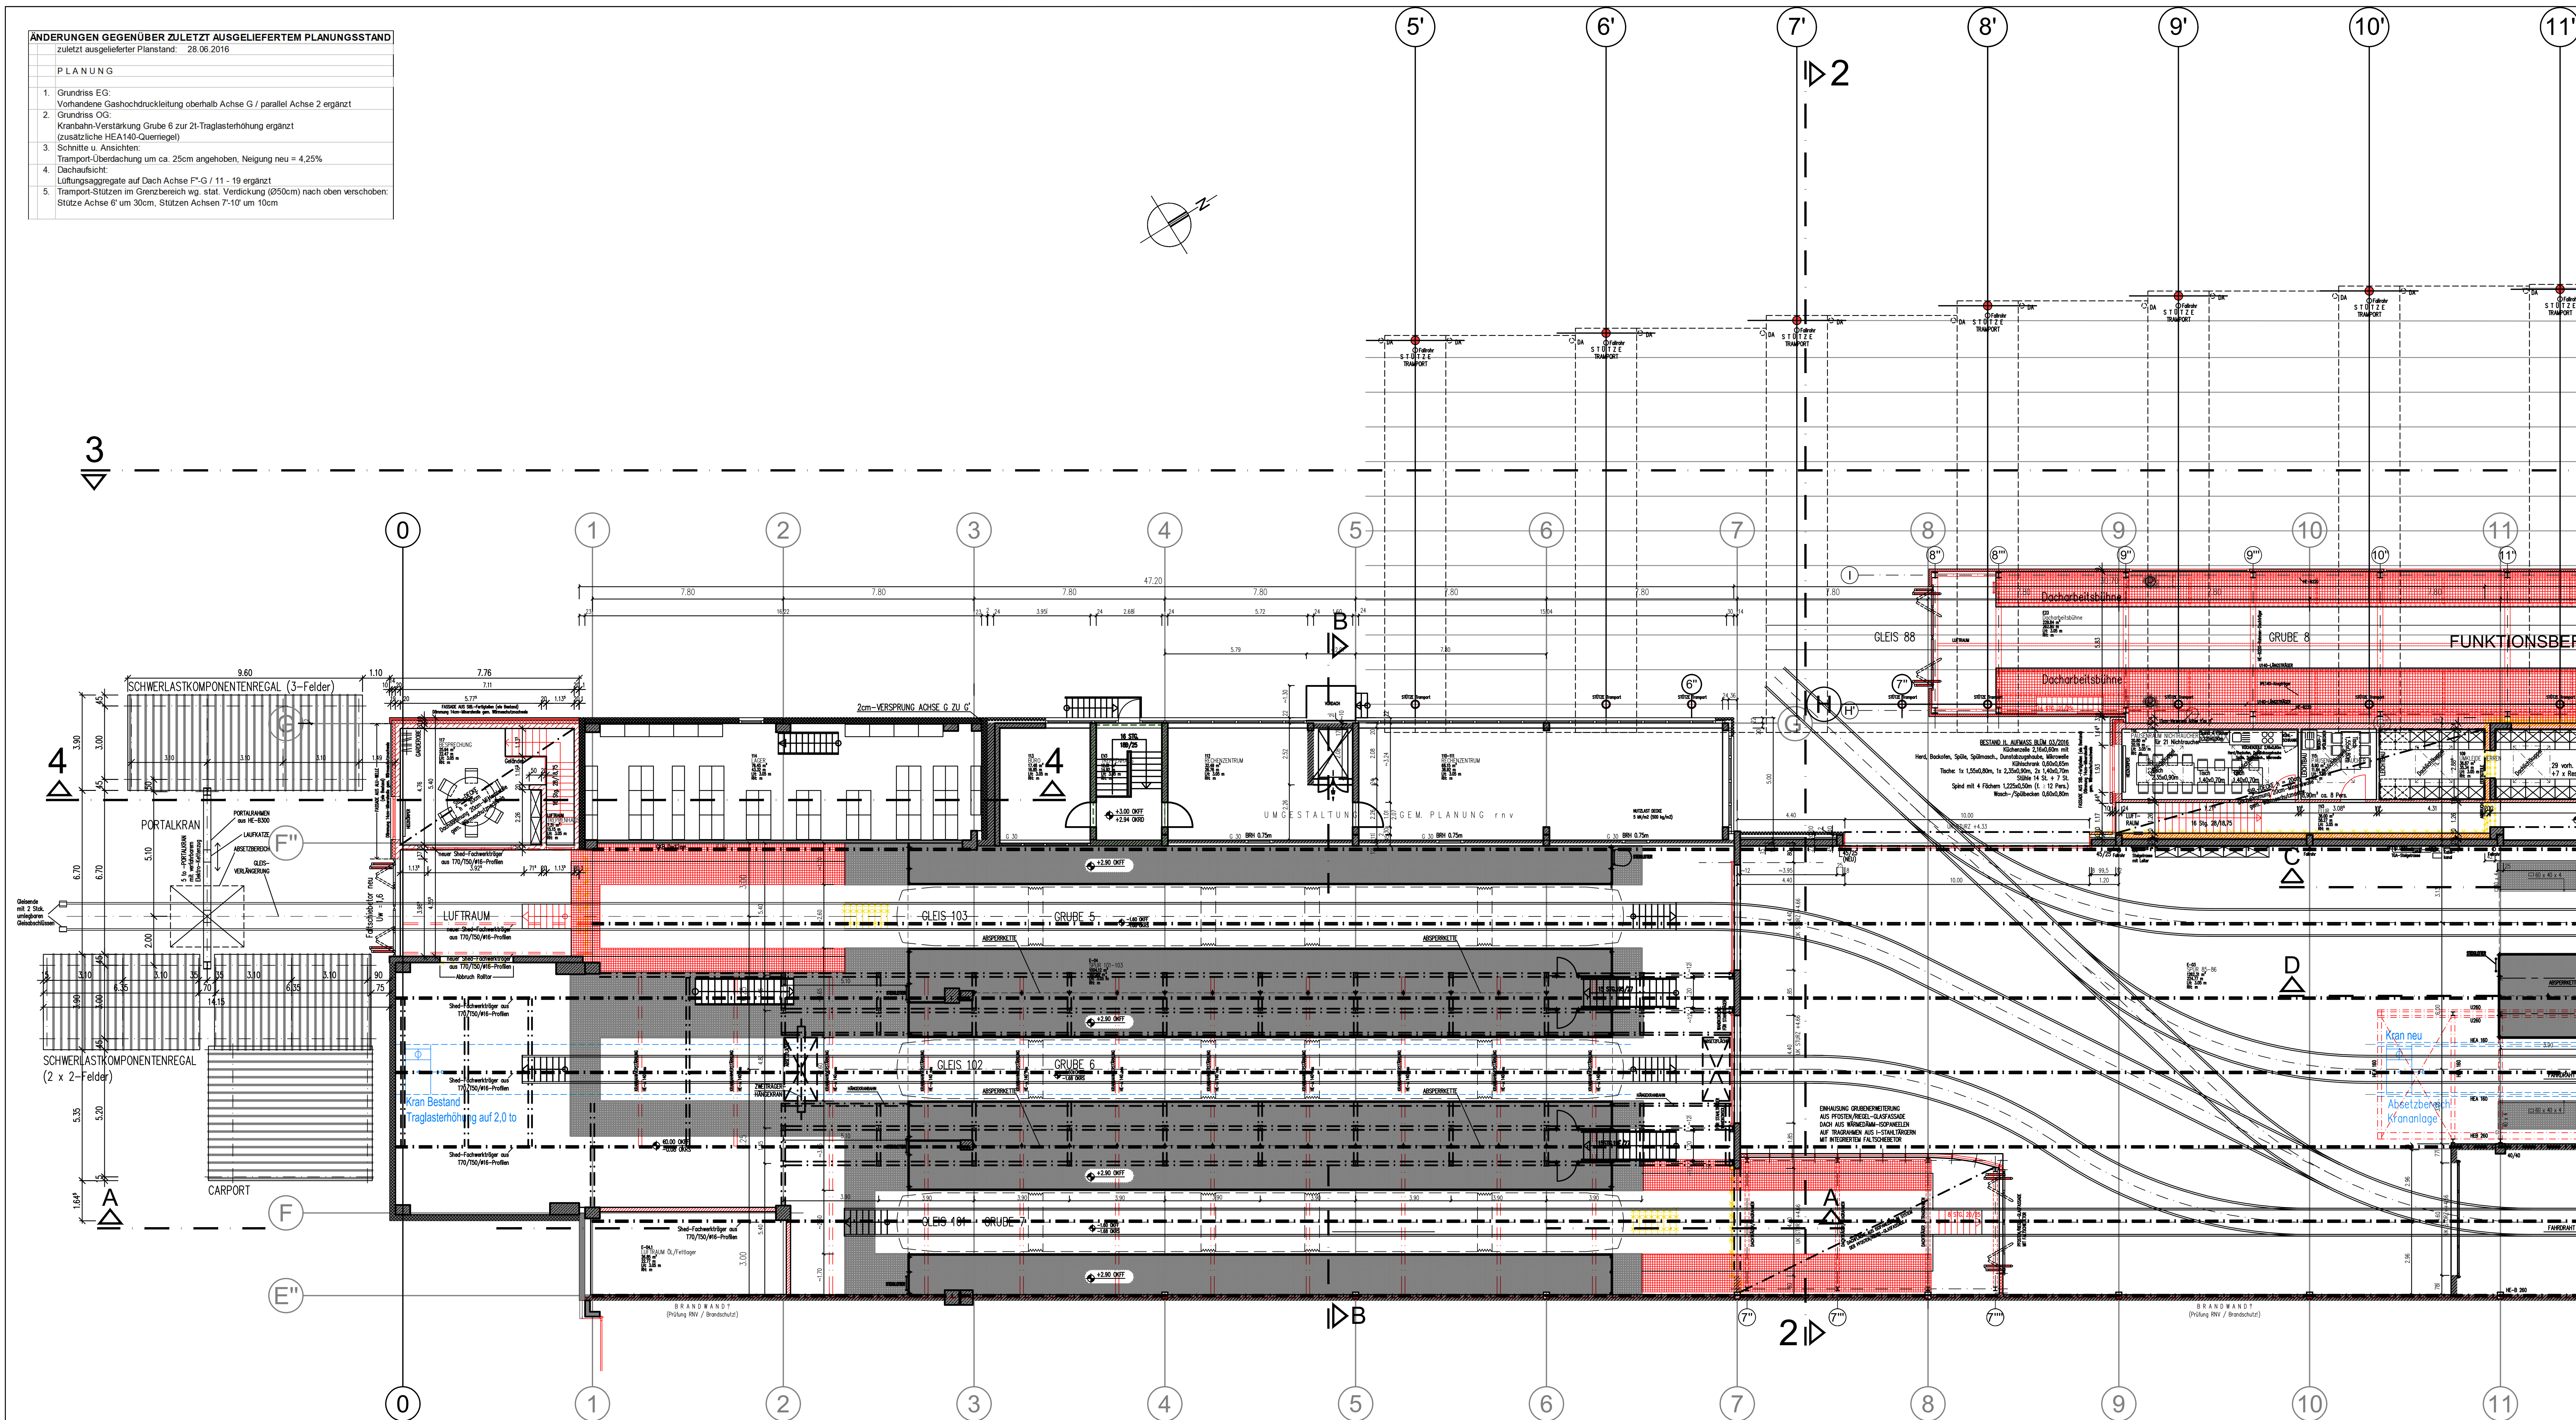


| ÄNDERUNGEN GEGENÜBER ZULETZT AUSGELEERTEM PLANUNGSSTAND |  | ZULETZT ausgefertigter Planstand: 28.06.2016 |
|---|--|--|
|   | PLANUNG  |  |
| 1.  | Grundriss EG:  |  |
|   | Vorhandene Gießschuckdruckleitung oberhalb Achse G / parallel Achse 2 ergänzt              |  |
| 2.  | Grundriss OG:  |  |
|   | Kranbahn-Verstärkung Gruppe 6 zur 2r-Traglastenhöhenangabe (zusätzliche H41-40 Querriegel) |  |
| 3.  | Schritte u. Antriebe:  |  |
|   | Tramport-Überdachung um ca. 25cm angehoben. Neigung neu = 4,25%                            |  |
| 4.  | Deckschacht:   |  |
|   | Luftungsaggregate auf Dach Achse P-G / 11 - 19 ergänzt                                     |  |
|   | Stütz-Pfosten im Grenzbereich zw. st. Verdickung (Ø50cm) nach oben verschoben:             |  |
|   | Stütze Achse G 60cm, Stützen Achsen 7-10 um 10cm   |  |



# AUFLISTUNG DER EINZELMASSNAHMEN

**FB 1 - ÜBERDACHUNG STRAB - FAHRZEUGABSTELLUNG (Transport)**

- 1.1. Gleis-Abbruch und -Neuerlegung
- 1.2. Transport mit Sattelzug-Gabelstapleranhänger u. extensiver Dachbegrenzung
- 1.3. Abbruch Fährleitungsmasten im Bereich Transportüberdachung; Umhängung der Fährleitungen an Transport-Dachträgern (Planung RVN)

**FB 2 - BESANDUNGSHÄLLE**

- 2.1. Besandungshalle einreihig Arbeitsgruppe u. Dachabstützsbühnen
- 2.2. Besandungshalle

**FB 3 - STRAB - BETRIEBSWERKSTATT**

AUSSENBEREICH - Neubaulmaßnahmen

- 3.1. Anbau Rampengruppe "Meisterbüro / Besprechung" Achsen 0+1 / F-G
- 3.2. Anbau Rampengruppe Achsen 9+11 / F-G  
incl. Erneuerung der Dachabstützung Achse 11+19
- 3.3. Verlängerung Sheddach auf Achse 0+1 bis Achse 9\*
- 3.4. Verlängerung Gleise 5 bis Achse 5
- 3.5. Technik-Zentrale Weichensteuerung (Fertigfab-Bauwerk)  
(der ehem. geplante Neubau Abstellanlage entfallen)
- 3.6. Carport als Unterstand für Container u. VW-Bus (Stahlbau auf Stahlstützen)
- 3.7. Schwertkastenmontage (Umgebung Achse 1 u. Verlängerung)

AUSSENBEREICH - Umbaumaßnahmen

- 3.8. Abbruch Ausfentriegeln entlang Nordwest-Fassade Achse G/G\*
- 3.9. Umbau Licht-Ausfentriegelung Topperhaus Achsen G/G+17-17 (alte Stahltrappe)
- 3.10. Abbruch u. Neubau Einfriedung u. vom. Zaun- / Toranlagen
- 3.11. Verlegung Sandungsbahn - Abscheider
- 3.12. Abbruch vom Fassadenbekleidungen entlang Besandungshalle Achsen 11+16
- 3.13. Verschieben von Fensterrahmen im Bereich Besandungshalle Achsen 11+16

**INNERBEREICH - Umbaumaßnahmen**

- 3.14. Erweiterung Gruppe 5 u. Gleis 103
- 3.15. Erweiterung Gruppe 7 u. Gleis 101
- 3.16. Einbauung Grubenverkleidung Gruppe 7 / Gleis 101 (Glasfassade)
- 3.18. Abbruch diverse EG-Innenwände
- 3.19. Abbruch Fassade 2-Tor / Torelement Bereich Meisterbüro / Sheddachverlängerung
- 3.20. Umbau Sanierungs- und Abstellplatz / Waschraum im OG
- 3.21. Einbau Faltseilachse-Anlage Südwest-Fassade Achse 0 / bei F
- 3.23. Brandschutzertüchtigung Wand Achse 6 u. diverser Bauteile gem. Anforderung
- 3.24. Erneuerung der Entrauchung
- 3.27. Umrüstung ehem. Meisterbüro zum Handlager
- 3.28. Erweiterung Dachabstützsbühne Gruppe 5 u. Gleis 103
- 3.29. Erweiterung Dachabstützsbühne Gruppe 7 u. Gleis 101

**4 BETRIEBS TECHNIK**

- 4.1. Seitenbereichsgruppe Gleis 5 auf Bodeneisenbahn verfahrbar, deshalb FB neu
- 4.2. Medienanastalt der Seitenrampen im Zuge der Grubenverkleidung  
siehe Pkt. 2.2. (ehem. Besandungshalle)
- 4.3. Tragstiefenhöhen Kran Gruppe 6 / Gleis 102
- 4.5. Krananlage neu Gruppe 4 / Gleis 85
- 4.6. Portalkran
- 4.7. Öl-/Wasser- und Entsorgung

**5 TGA / ELEKTRO**

- 5.1.11. gem. TGA-Planung Info-Büro Stillsetzen

