Willstätter Gymnasium, Nürnberg | Dach- und Fassadensanierung
Ausführungsplanung

LEEVEN architekten Partnerschaft mbB

Ablaufplan Ausführung Fortschreibung
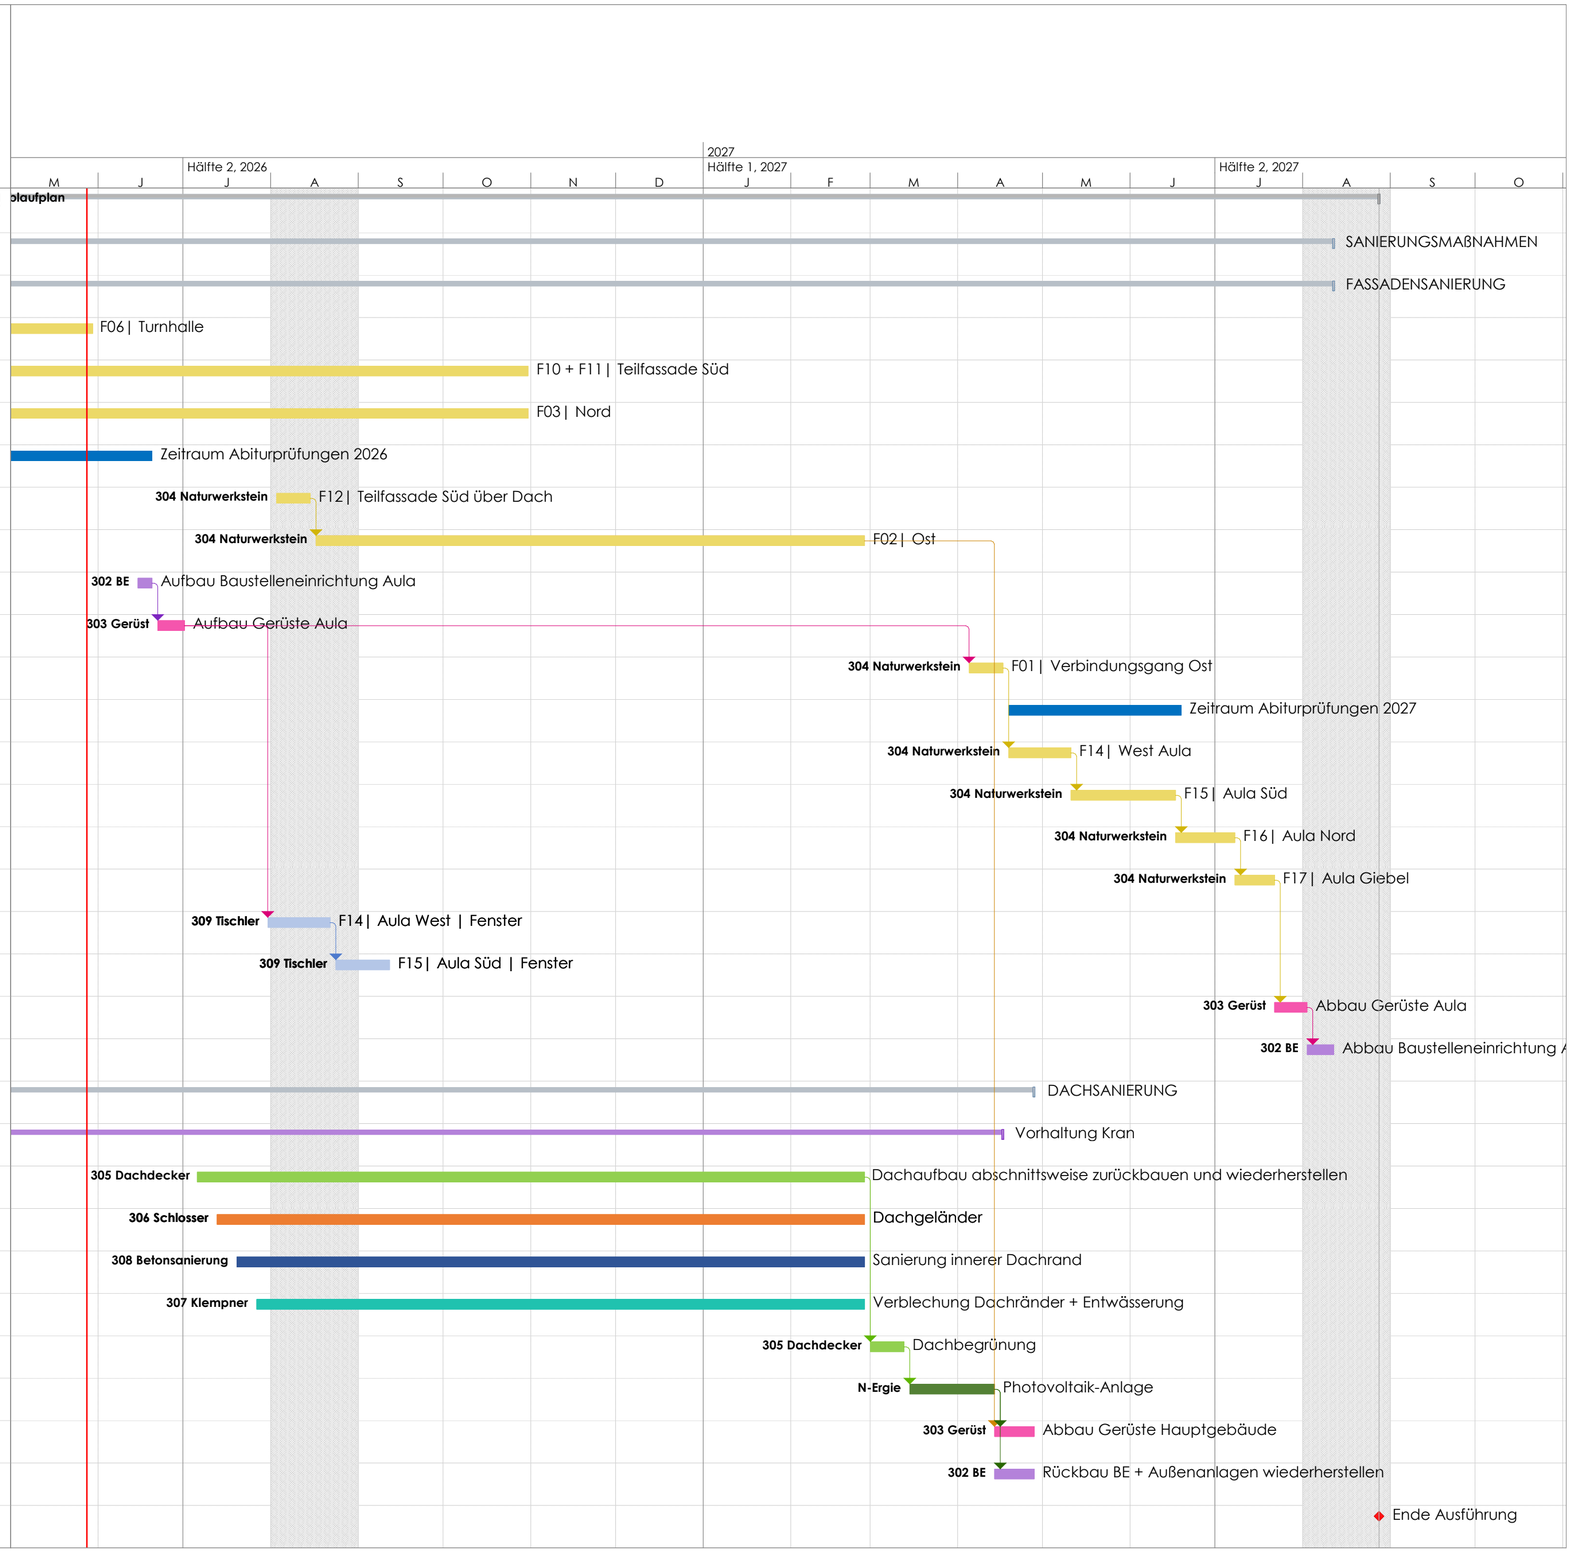
Nr.	Gewerk	Vorgangsname	Dauer	Anfang
0		**Ablaufplan**	**140,8 Woch**	**Don 24.10.24**
86		**SANIERUNGSMAßNAHMEN**	**99 Wochen?**	**Die 12.08.25**
87		**FASSADENSANIERUNG**	**98,2 Wochen?**	**Mon 18.08.25**
88	304 Naturwerkstein	F06| Turnhalle	37,4 Wochen	Mon 18.08.25
89	304 Naturwerkstein	F10 + F11| Teilfassade Süd	54,2 Wochen	Mon 22.09.25
90	304 Naturwerkstein	F03| Nord	50,4 Wochen	Mon 20.10.25
93		Zeitraum Abiturprüfungen 2026	41 Tage?	Mon 20.04.26
94	304 Naturwerkstein	F12| Teilfassade Süd über Dach	2 Wochen	Mon 03.08.26
96	304 Naturwerkstein	F02| Ost	27,4 Wochen	Mon 17.08.26
97	302 BE	Aufbau Baustelleneinrichtung Aula	1 Woche	Mon 15.06.26
98	303 Gerüst	Aufbau Gerüste Aula	1,5 Wochen	Mon 22.06.26
99	304 Naturwerkstein	F01| Verbindungsgang Ost	2 Wochen	Mon 05.04.27
100		Zeitraum Abiturprüfungen 2027	42 Tage?	Mon 19.04.27
101	304 Naturwerkstein	F14| West Aula	3 Wochen	Mon 19.04.27
102	304 Naturwerkstein	F15| Aula Süd	5 Wochen	Die 11.05.27
103	304 Naturwerkstein	F16| Aula Nord	3 Wochen	Don 17.06.27
104	304 Naturwerkstein	F17| Aula Giebel	2 Wochen	Don 08.07.27
105	309 Tischler	F14| Aula West | Fenster	3,2 Wochen	Fre 31.07.26
106	309 Tischler	F15| Aula Süd | Fenster	3 Wochen	Mon 24.08.26
107	303 Gerüst	Abbau Gerüste Aula	1,5 Wochen	Don 22.07.27
108	302 BE	Abbau Baustelleneinrichtung Aula	1,5 Wochen	Mon 02.08.27
112		**DACHSANIERUNG**	**84 Wochen**	**Don 14.08.25**
113	**302 BE**	**Vorhaltung Kran**	**79,8 Wochen**	**Mit 03.09.25**
115	305 Dachdecker	Dachaufbau abschnittsweise zurückbauen und wiederh	33,4 Wochen	Mon 06.07.26
116	306 Schlosser	Dachgeländer	32,4 Wochen	Mon 13.07.26
117	308 Betonsanierung	Sanierung innerer Dachrand	31,4 Wochen	Mon 20.07.26
118	307 Klempner	Verblechung Dachränder + Entwässerung	30,4 Wochen	Mon 27.07.26
119	305 Dachdecker	Dachbegrünung	2 Wochen	Mon 01.03.27
120	N-Ergie	Photovoltaik-Anlage	4 Wochen	Mon 15.03.27
121	303 Gerüst	Abbau Gerüste Hauptgebäude	2 Wochen	Mit 14.04.27
122	302 BE	Rückbau BE + Außenanlagen wiederherstellen	2 Wochen	Mit 14.04.27
132		**Ende Ausführung**	**1 Tag**	**Fre 27.08.27**
