Projektnummer: 239.19

Bauzeitenplan

MWS Erweiterung
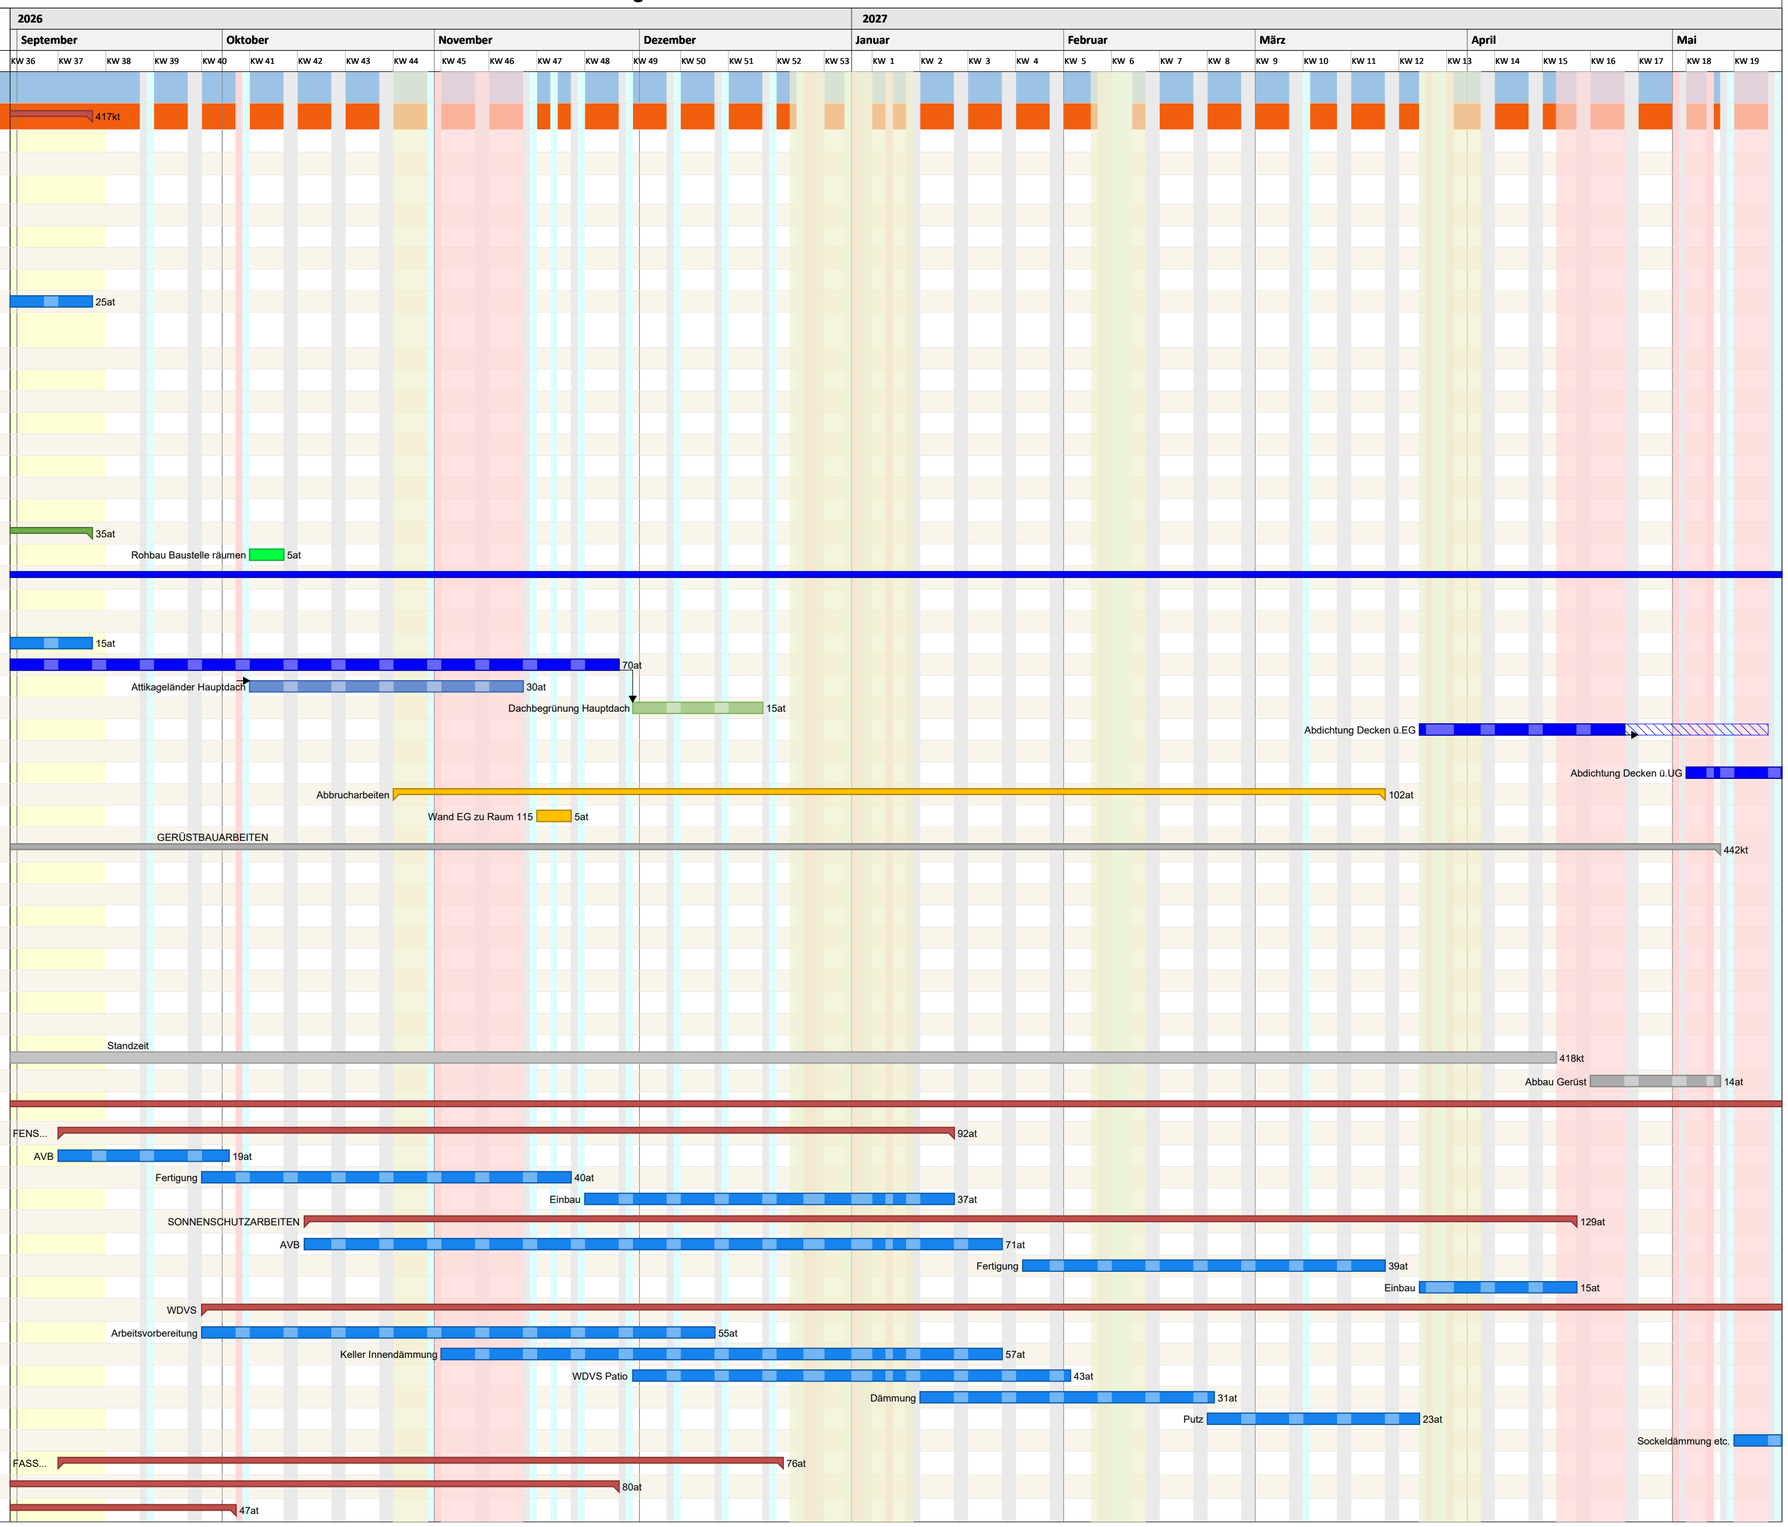
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer
82	**ERWEITERUNSBAU**				
83	**ROHBAUARBEITEN**	417kt	Di, 22.07.25	Fr, 11.09.26	
83.1	**Baustellenkran Gründung und Aufbau**	56kt	Di, 22.07.25	Mo, 15.09.25	
83.2	**Baustelleneinrichtung**	5at	Mo, 15.09.25	Fr, 19.09.25	Schleith
83.3	**Baubeginn Rohbau**	1at	Mi, 17.09.25	Mi, 17.09.25	
83.4	**Gründung und Kellergeschoss**	147at	Mi, 17.09.25	Mo, 20.04.26	
83.5	**Wände UG**	106at	Mo, 13.10.25	Fr, 13.03.26	
83.6	**Blitzschutz/Erdung UG**	71at	Do, 11.09.25	Fr, 19.12.25	ROM
83.7	Blitzschutz EG -3.OG	91at	Mo, 13.04.26	Fr, 21.08.26	
83.8	Blitzschutz Attika	25at	Mo, 10.08.26	Fr, 11.09.26	
83.9	**Decke über KG**	45at	Mo, 26.01.26	Fr, 27.03.26	
83.10	**Erdgeschoss**	179at	Mo, 01.09.25	Mi, 20.05.26	
83.11	Notabdichtung Decke ü.EG	4at	Di, 19.05.26	Fr, 22.05.26	
84	PRÜFUNGSZEIT!!!!	85kt	Mi, 22.04.26	Mi, 15.07.26	
85	**Demontage Tafeln**	31at	Fr, 05.06.26	Fr, 17.07.26	
83.12	**1.Obergeschoss**	22at	Fr, 15.05.26	Mi, 17.06.26	
86	**2.Obergeschoss**	22at	Mo, 08.06.26	Di, 07.07.26	
87	**3.Obergeschoss**	26at	Mo, 29.06.26	Mo, 03.08.26	
88	**Wände UG ?**	10at	Mo, 03.08.26	Fr, 14.08.26	
89	Attika	35at	Mo, 27.07.26	Fr, 11.09.26	
90	Rohbau Baustelle räumen	5at	Mo, 05.10.26	Fr, 09.10.26	
91	**DACHABDICHTUNGSARBEITEN**	299at	Fr, 27.03.26	Di, 08.06.27	
91.1	Notabdichtung Decke ü.UG	21at	Fr, 27.03.26	Di, 28.04.26	
91.2	Notabdichtung Decke ü.EG	10at	Mo, 18.05.26	Mo, 01.06.26	
91.3	Deckel Einbringöffnung	15at	Mo, 24.08.26	Fr, 11.09.26	
91.4	Abdichtungsarbeiten Hauptdach	70at	Mo, 24.08.26	Fr, 27.11.26	
91.5	Attikageländer Hauptdach	30at	Mo, 05.10.26	Fr, 13.11.26	
91.6	Dachbegrünung Hauptdach	15at	Mo, 30.11.26	Fr, 18.12.26	
91.7	Abdichtung Decken ü.EG	20at	Do, 25.03.27	Fr, 23.04.27	
91.8	Dachbegrünung Decke ü.EG	15at	Di, 18.05.27	Di, 08.06.27	
91.9	Abdichtung Decken ü.UG	22at	Mo, 03.05.27	Fr, 04.06.27	
92	Abbrucharbeiten	102at	Mo, 26.10.26	Fr, 19.03.27	
93	Wand EG zu Raum 115	5at	Mo, 16.11.26	Fr, 20.11.26	
94	**GERÜSTBAUARBEITEN**	442kt	Fr, 20.02.26	Fr, 07.05.27	
94.1	EG	11at	Mi, 01.04.26	Fr, 17.04.26	
94.2	1.OG	8at	Mi, 20.05.26	Mo, 01.06.26	
94.3	2.OG	6at	Mo, 22.06.26	Mo, 29.06.26	
94.4	3.OG	14at	Fr, 10.07.26	Mi, 29.07.26	
94.5	Attika	9at	Di, 28.07.26	Fr, 07.08.26	
94.6	Schutzdach Eingang	5at	Mi, 29.07.26	Di, 04.08.26	
94.7	Patio	19at	Do, 16.07.26	Di, 11.08.26	
94.8	Treppentürme	93at	Di, 17.03.26	Fr, 31.07.26	
94.9	Standzeit	418kt	Fr, 20.02.26	Di, 13.04.27	
94.10	Abbau Gerüst	14at	Mo, 19.04.27	Fr, 07.05.27	
95	**Gebäudehülle**	209at	Do, 30.07.26	Fr, 28.05.27	
95.1	**FENSTERBAUARBEITEN**	92at	Mo, 07.09.26	Fr, 15.01.27	
95.1.1	AVB	19at	Mo, 07.09.26	Do, 01.10.26	
95.1.2	Fertigung	40at	Mo, 28.09.26	Fr, 20.11.26	
95.1.3	Einbau	37at	Mo, 23.11.26	Fr, 15.01.27	
95.2	**SONNENSCHUTZARBEITEN**	129at	Di, 13.10.26	Fr, 16.04.27	
95.2.1	AVB	71at	Di, 13.10.26	Fr, 22.01.27	
95.2.2	Fertigung	39at	Di, 26.01.27	Fr, 19.03.27	
95.2.3	Einbau	15at	Do, 25.03.27	Fr, 16.04.27	
95.3	**WDVS**	167at	Mo, 28.09.26	Fr, 28.05.27	
95.3.1	Arbeitsvorbereitung	55at	Mo, 28.09.26	Fr, 11.12.26	
95.3.2	Keller Innendämmung	57at	Mo, 02.11.26	Fr, 22.01.27	
95.3.3	WDVS Patio	43at	Mo, 30.11.26	Mo, 01.02.27	
95.3.4	Dämmung	31at	Mo, 11.01.27	Mo, 22.02.27	
95.3.5	Putz	23at	Mo, 22.02.27	Mi, 24.03.27	
95.3.6	Sockeldämmung etc.	13at	Mo, 10.05.27	Fr, 28.05.27	
95.4	**FASSADENBAUARBEITEN**	76at	Mo, 07.09.26	Mo, 21.12.26	
95.5	**METALLBAUARBEITEN**	80at	Mo, 10.08.26	Fr, 27.11.26	
95.6	**STAHLBAUARBEITEN**	47at	Do, 30.07.26	Fr, 02.10.26
