Parkdeck Bestand

Rigolenüberdeckung
Höhe Schotterschicht Bau
≥ 311,02m üNHN

Vorbereitung BE-Fläche
- Auffüllung in Schichten 20-30cm gem. FP AA /HLS
- Gräben für Leerrohre bei OK Auffüllung =
  ca. 310,0m üNHN (Annahme prüfen)
- Aufbauhöhe Frostschutzschicht = ca. 31cm
- Aufbauhöhe Schotterschicht Bau = ca. 30-40cm
- **Rigolenüberdeckung beachten!**

BE-Fläche
ca. 1.435,28 m²

Erdarbeiten unter Sohle – Arbeitsebene 3
- Auffüllen in Schichten 20-30cm
- Herstellung Gründungspolster in Abschnitten
- Verlegen der Grundleitungen parallel mit Herstellung Gründungspolster / Schachtbauten

Sohle A
UK Sohle = 311,85m NHN
UK Sauberkeitsschicht = **311,59m** NHN
UK Gründungspolster = 310,99m NHN

Sohle B
UK Sohle = 312,05m NHN
UK Sauberkeitsschicht = 311,79m NHN
UK Gründungspolster = 311,19m NHN

Sohle C1
UK Sohle = 311,55m NHN
UK Sauberkeitsschicht = 311,29m NHN
UK Gründungspolster = 310,69m NHN

Sohle C2
UK Sohle = 311,45m NHN
UK Sauberkeitsschicht = 311,19m NHN
UK Gründungspolster = 310,59m NHN

Sohle D
UK Sohle = 311,60m NHN
UK Sauberkeitsschicht = **311,38 bzw. 311,34**m NHN
UK Gründungspolster = 310,74m NHN

Sohle E
UK Sohle = 311,35m NHN
UK Sauberkeitsschicht = **311,13m bzw. 311,09m** NHN
UK Gründungspolster = 310,49m NHN

UK Randbalken= 310,65m NHN
UK Sauberkeitsschicht = 310,55m NHN
UK Gründungspolster = 309,95m NHN

UK Sohle = 311,10m NHN
UK Sauberkeitsschicht = **310,84m** NHN
UK Gründungspolster = 310,24m NHN

Kranfundament

VK Planum Hochbau

Baumschutzzaun aus Holz

Zugang

517,72 m²
Vegetationsbestand erhalten

Bamberger Straße

Hinweis:
Dieser Plan stellt schematisch den Leistungsumfang Erdarbeiten dar. Eine Ausführung erfolgt auf Basis der freigegebenen Ausführungsplanung der jeweiligen Fachplanungen.

Baunull:
OK-FFB EG _ILS = 312,50 ü NHN
OK-FFB EG _KN = 312,15 ü NHN

Bemessungswasserstand
HGW OK = 309,50 ü NHN


Tiefe > 1,25m
Tiefe ≤ 1,25m

- Schmutzwasser, Bettung ca. 15-20cm
- Regenwasser, Bettung ca. 15-20cm
- Trinkwasser, Bettung ≥10cm
- Leerrohre ELT Bettung ≥20cm
- Leerrohre ELT Bettung ≥20cm 2-lagig mittels Abstandhalter
- Leerrohre ELT Bettung ≥20cm 3-lagig mittels Abstandhalter
- Leerrohre GA, Bettung ≥20cm
- Wärmeleitung Geothermie, Bettung ≥20cm

Provisorische Abdeckung über Verteiler Geothermie und Schachtabdeckungen SAN/ELT notwendig


312.00
311.50
311.00
310.50
310.00
309.50
309.00
308.50

Gebäudeaufbau:



Höhenbezug:
Gebäudeteile A-C
OKFF ±0.00
= +312,50 üNHN


Gebäudeteile D-E
OKFF ±0.00
= +312,15 üNHN



SBK 1
(offen)

Index	Änderungen-Name	Datum	Name
-		02.10.26	
A		14.10.26	Saskia Hartkopf

Höhen Baufeld Süd

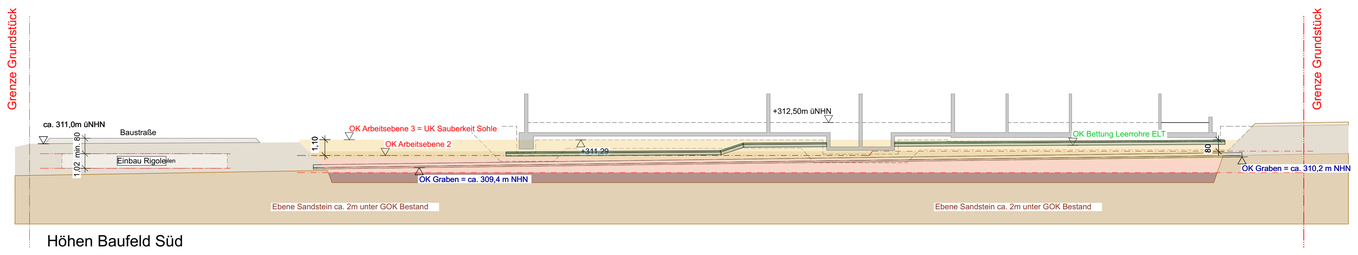

PLANINHALT
Konzept_Erdbau_Arbeitsebene_3

PROJEKT
ILK
Ausschreibung - LP6

BAUHERR*IN

PLANVERFASSER*IN

HAUSTECHNIK_HKLS

HAUSTECHNIK_ELT

STATIK

FORMAT	MASSSTAB	ERSTELLT	BEARBEITET
900x1200	1:200	14.10.2026	imw

PLANNUMMER
ILK_L6_X_TPZ_UE_X_GRL_113

INDEX
A
