Projektnummer: 24-11

Bauzeitenplan

Innensanierung Berufliche Schulen Kehl - Bau G (grün) - Stand 21.05.2026

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	Bauausführung 2.BA	299at	Di, 12.05.26	Do, 29.07.27
1.1	Abbruch/Rückbau 3.OG	8at	Di, 12.05.26	Fr, 22.05.26
1.2	Abbruch/Rückbau 2.OG	8at	Di, 26.05.26	Fr, 05.06.26
1.3	Abbruch/Rückbau 1.OG	10at	Mo, 08.06.26	Fr, 19.06.26
1.4	Abbruch/Rückbau EG	10at	Mo, 22.06.26	Fr, 03.07.26
1.5	Kernbohrungen & Durchbrüche 3.OG	5at	Mo, 06.07.26	Fr, 10.07.26
1.6	Kernbohrungen & Durchbrüche 2.OG	5at	Mo, 13.07.26	Fr, 17.07.26
1.7	Kernbohrungen & Durchbrüche 1.OG	5at	Mo, 20.07.26	Fr, 24.07.26
1.8	Kernbohrungen & Durchbrüche EG	5at	Mo, 27.07.26	Fr, 31.07.26
1.9	Rohbauarbeiten 3.OG	15at	Mo, 20.07.26	Fr, 07.08.26
1.10	Rohbauarbeiten 2.OG	15at	Mo, 10.08.26	Fr, 28.08.26
1.11	Rohbauarbeiten 1.OG	15at	Mo, 31.08.26	Fr, 18.09.26
1.12	Rohbauarbeiten EG	15at	Mo, 21.09.26	Fr, 09.10.26
1.13	Innenputz 3.OG	15at	Mo, 31.08.26	Fr, 18.09.26
1.14	Innenputz 2.OG	15at	Mo, 21.09.26	Fr, 09.10.26
1.15	Innenputz 1.OG	15at	Mo, 12.10.26	Fr, 30.10.26
1.16	Innenputz EG	15at	Mo, 02.11.26	Fr, 20.11.26
1.17	Heizungsinstallation Steigetrassen	30at	Mo, 31.08.26	Fr, 09.10.26
1.18	Trockenbauwände einseitig 3.OG	10at	Mo, 21.09.26	Fr, 02.10.26
1.19	Trockenbauwände einseitig 2.OG	10at	Mo, 05.10.26	Fr, 16.10.26
1.20	Trockenbauwände einseitig 1.OG	10at	Mo, 19.10.26	Fr, 30.10.26
1.21	Trockenbauwände einseitig EG	10at	Mo, 02.11.26	Fr, 13.11.26
1.22	Leerrohre Trockenbauwände 3.OG	2at	Mo, 05.10.26	Di, 06.10.26
1.23	Leerrohre Trockenbauwände 2.OG	2at	Mo, 19.10.26	Di, 20.10.26
1.24	Leerrohre Trockenbauwände 1.OG	2at	Mo, 02.11.26	Di, 03.11.26
1.25	Leerrohre Trockenbauwände EG	2at	Mo, 16.11.26	Di, 17.11.26
1.26	Trockenbauwände schließen 3.OG	10at	Mo, 19.10.26	Fr, 30.10.26
1.27	Trockenbauwände schließen 2.OG	10at	Mo, 02.11.26	Fr, 13.11.26
1.28	Trockenbauwände schließen 1.OG	10at	Mo, 16.11.26	Fr, 27.11.26
1.29	Trockenbauwände schließen EG	10at	Mo, 30.11.26	Fr, 11.12.26
1.30	Unterkonstruktion Kabelrinnen	15at	Mo, 23.11.26	Fr, 11.12.26
1.31	Rohinstallationen HLS 3.OG	15at	Mo, 05.10.26	Fr, 23.10.26
1.32	Rohinstallationen HLS 2.OG	15at	Mo, 26.10.26	Fr, 13.11.26
1.33	Rohinstallationen HLS 1.OG	15at	Mo, 16.11.26	Fr, 04.12.26
1.34	Rohinstallationen HLS EG	14at	Mo, 07.12.26	Do, 24.12.26
1.35	Bauzwischenreinigung	4at	Mo, 21.12.26	Do, 24.12.26
1.36	Randfriese 3.OG	9at	Mo, 14.12.26	Do, 24.12.26
1.37	Randfriese 2.OG	10at	Mo, 11.01.27	Fr, 22.01.27
1.38	Randfriese 1.OG	10at	Mo, 25.01.27	Fr, 05.02.27
1.39	Randfriese EG	10at	Mo, 08.02.27	Fr, 19.02.27
1.40	Rinnen+Rohinstallation Elektro 3.OG	10at	Mo, 11.01.27	Fr, 22.01.27
1.41	Rinnen+Rohinstallation Elektro 2.OG	10at	Mo, 25.01.27	Fr, 05.02.27
1.42	Rinnen+Rohinstallation Elektro 1.OG	10at	Mo, 08.02.27	Fr, 19.02.27
1.43	Rinnen+Rohinstallation Elektro EG	10at	Mo, 22.02.27	Fr, 05.03.27
1.44	Decken schließen 3.OG	10at	Mo, 22.02.27	Fr, 05.03.27
1.45	Decken schließen 2.OG	10at	Mo, 08.03.27	Fr, 19.03.27
1.46	Decken schließen 1.OG	8at	Mo, 22.03.27	Fr, 02.04.27
1.47	Decken schließen EG	10at	Mo, 05.04.27	Fr, 16.04.27
1.48	Bauzwischenreinigung	5at	Mo, 08.03.27	Fr, 12.03.27
1.49	Malerarbeiten 3.OG	14at	Mo, 08.03.27	Do, 25.03.27
1.50	Malerarbeiten 2.OG	14at	Di, 30.03.27	Fr, 16.04.27
1.51	Malerarbeiten 1.OG	14at	Mo, 19.04.27	Fr, 07.05.27
1.52	Malerarbeiten EG	13at	Mo, 10.05.27	Fr, 28.05.27
1.53	Fliesenarbeiten 3.OG	15at	Mo, 11.01.27	Fr, 29.01.27
1.54	Fliesenarbeiten 2.OG	15at	Mo, 01.02.27	Fr, 19.02.27
1.55	Fliesenarbeiten 1.OG	15at	Mo, 22.02.27	Fr, 12.03.27
1.56	Fliesenarbeiten EG	13at	Mo, 15.03.27	Fr, 02.04.27
1.57	Fertiginstallation HLSE 3.OG	15at	Mo, 01.02.27	Fr, 19.02.27
1.58	Fertiginstallation HLSE 2.OG	15at	Mo, 22.02.27	Fr, 12.03.27
1.59	Fertiginstallation HLSE 1.OG	13at	Mo, 15.03.27	Fr, 02.04.27
1.60	Fertiginstallation HLSE EG	15at	Mo, 05.04.27	Fr, 23.04.27
1.61	Bodenbelagsarbeiten 3.OG	15at	Mo, 22.02.27	Fr, 12.03.27
1.62	Bodenbelagsarbeiten 2.OG	13at	Mo, 15.03.27	Fr, 02.04.27
1.63	Bodenbelagsarbeiten 1.OG	15at	Mo, 05.04.27	Fr, 23.04.27
1.64	Bodenbelagsarbeiten EG	14at	Mo, 26.04.27	Fr, 14.05.27
1.65	Sanitärtrennwände	8at	Mo, 26.04.27	Mi, 05.05.27
1.66	Rohrrahmentüren	8at	Di, 18.05.27	Fr, 28.05.27
1.67	Zargen und Türblätter	19at	Mo, 31.05.27	Do, 24.06.27
1.68	Bauendreinigung	10at	Fr, 25.06.27	Do, 08.07.27
1.69	Abnahmen und Restarbeiten	15at	Fr, 09.07.27	Do, 29.07.27
2	Übergabe an Nutzer	1at	Fr, 30.07.27	Fr, 30.07.27

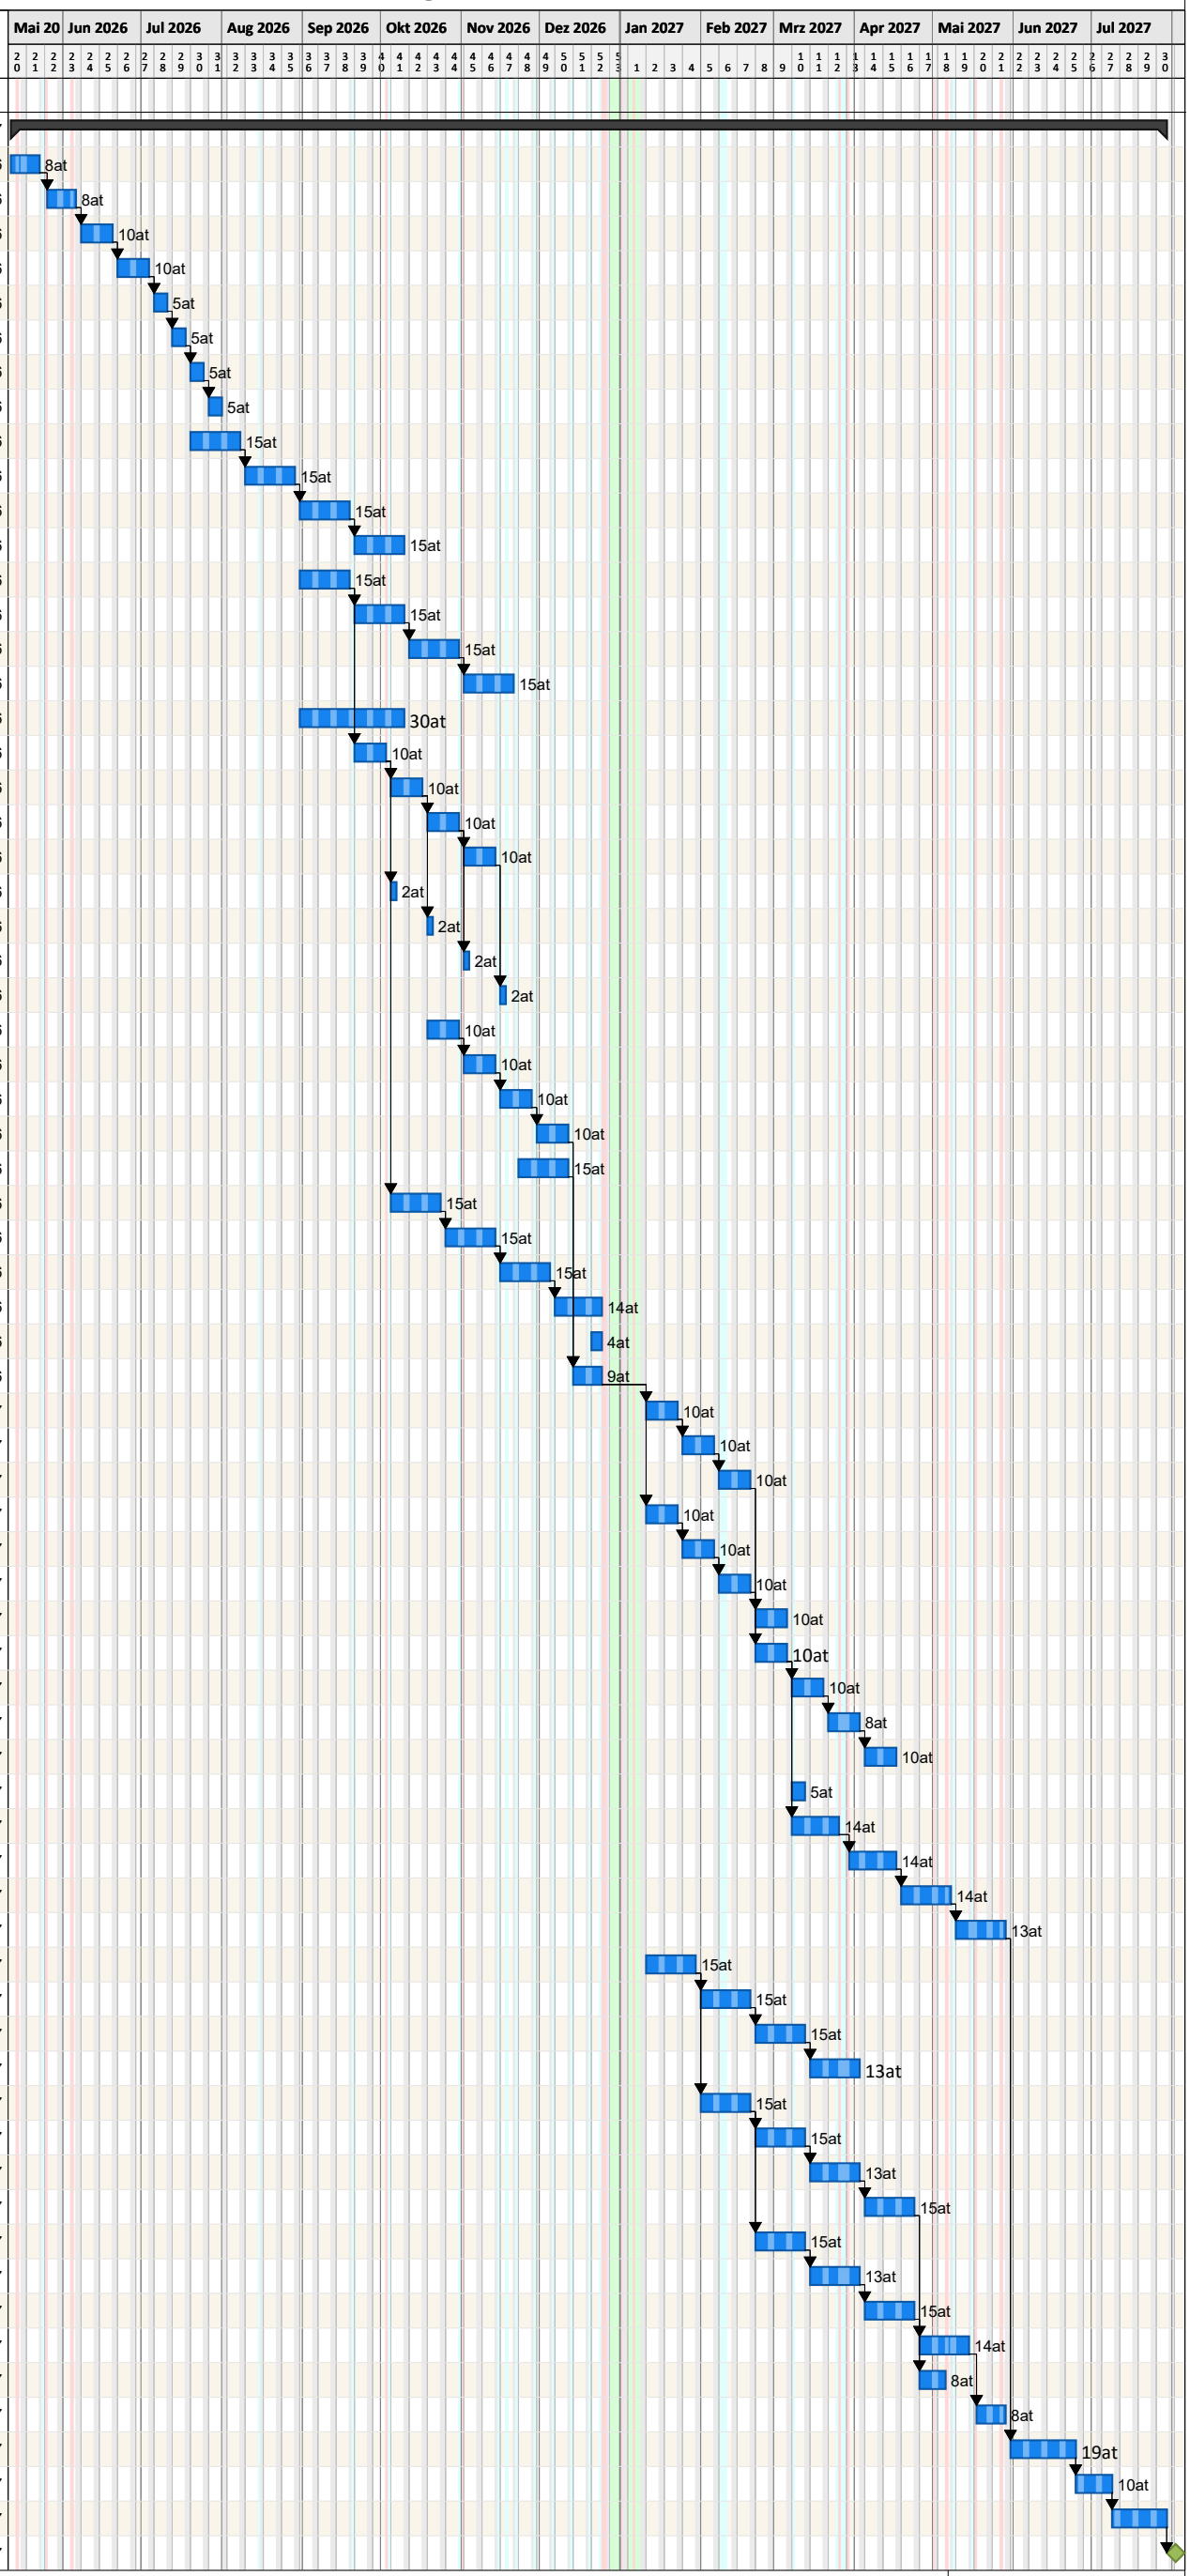

Projektzeitrahmen von Mo, 11.05.26 bis So, 08.08.27
Kalender: Baden-Württemberg ergänzt
Druckdatum: 21.05.2026 10:01
Filter:
Bearbeiter: Stefan Wisniowski

Feiertag
Infotag
Urlaub

LEIMBACH + BARTELS
architekten GmbH

Rheinstr. 66
Kehl
Tel. +49 7851 93430
Fax +49 7851 934320
e-Mail: buero@architektenlb.de

erstellt mit pro-Plan 2025 (pro-Plan 2025) Serien Nr.: PPL25-765f87074AA4 Lizenz für Leimbach + Bartels, Kehl
