
Bauzeitenplan

240416_Rahmenterminplan

Pos	Vorgang	Start	Ende
1.29	031.4 - Schlosserarbeiten	Mo, 22.02.27	Fr, 05.11.27
1.29.1	Kick Off	Mo, 22.02.27	Fr, 26.02.27
1.29.2	Werk- Montageplanung	Mo, 01.03.27	Fr, 02.04.27
1.29.3	Prüfung Architekt	Mo, 22.03.27	Fr, 02.04.27
1.29.4	Einarbeiten Prüfbemerkungen Architekt	Mo, 05.04.27	Fr, 09.04.27
1.29.5	Prüfung Prüfingenieur	Mo, 05.04.27	Fr, 23.04.27
1.29.6	Einarbeiten Prüfbemerkungen Architekt	Mo, 26.04.27	Fr, 30.04.27
1.29.7	Materialbestellung Lieferzeiten	Mo, 26.04.27	Fr, 11.06.27
1.29.8	Treppengeländer TRH 1, ILtS	Mo, 14.06.27	Fr, 02.07.27
1.29.9	Einzelfrist Fertigstellung TRH 1, ILtS	Fr, 02.07.27	Fr, 02.07.27
1.29.10	Treppengeländer TRH 2, ILtS	Mo, 05.07.27	Fr, 16.07.27
1.29.11	Einzelfrist Fertigstellung TRH 2, ILtS	Fr, 16.07.27	Fr, 16.07.27
1.29.12	Restarbeiten ILtS	Mo, 19.07.27	Fr, 23.07.27
1.29.13	Treppengeländer TRH 1 FW, RD	Mo, 19.07.27	Fr, 06.08.27
1.29.14	Einzelfrist Fertigstellung TRH 1, FW, RD	Fr, 06.08.27	Fr, 06.08.27
1.29.15	Treppengeländer TRH 2, FW, RD	Mo, 09.08.27	Fr, 20.08.27
1.29.16	Einzelfrist Fertigstellung TRH 2, FW, RD	Fr, 20.08.27	Fr, 20.08.27
1.29.17	Treppengeländer TRH 3, FW, RD	Mo, 23.08.27	Fr, 03.09.27
1.29.18	Einzelfrist Fertigstellung TRH 3, FW, RD	Fr, 03.09.27	Fr, 03.09.27
1.29.19	Treppengeländer TRH 4	Mo, 06.09.27	Fr, 17.09.27
1.29.20	Einzelfrist Fertigstellung TRH 4, FW, RD	Fr, 17.09.27	Fr, 17.09.27
1.29.21	Restarbeiten Treppengeländer FW, RD	Mo, 20.09.27	Fr, 08.10.27
1.29.22	Treppengeländer TG 1/TG2	Mo, 28.06.27	Fr, 02.07.27
1.29.23	Treppengeländer Flur FW UG -1 Technik	Mo, 28.06.27	Fr, 02.07.27
1.29.24	Treppengeländer TRH 2 FW UG -1 zu Technik	Mo, 05.07.27	Fr, 09.07.27
1.29.25	Stahltreppe und Geländer Rotunde	Mo, 12.07.27	Fr, 30.07.27
1.29.26	Treppe und Geländer Disponentenraum	Mo, 02.08.27	Fr, 06.08.27
1.29.27	Handlauf Außentreppe	Mo, 09.08.27	Fr, 13.08.27
1.29.28	Handläufe Treppe UG -2 ILtS/HFW	Mo, 09.08.27	Fr, 13.08.27
1.29.29	Handlauf Brüstung FW 5, 6, 7, Loggia, ILtS 2	Mo, 09.08.27	Fr, 13.08.27
1.29.30	Absturzsicherung Foyer 1. OG	Mo, 16.08.27	Fr, 20.08.27
1.29.31	Absturzsicherung Einbringöffnung Fahrzeughalle 1.OG	Mo, 16.08.27	Fr, 20.08.27
1.29.32	Absturzsicherung Verbrauchmittellager	Mo, 23.08.27	Fr, 27.08.27
1.29.33	Absturzsicherung Außenwand H/20	Mo, 23.08.27	Fr, 27.08.27
1.29.34	Metallbekleidungen Trockensteigleitungen	Mo, 30.08.27	Fr, 17.09.27
1.29.35	Montage Zu- und Abluftgitter	Mo, 06.09.27	Fr, 17.09.27
1.29.36	Montage Hochwasserschutz/Brett	Mo, 20.09.27	Fr, 24.09.27
1.29.37	Montage UK-Kranbahn	Mo, 20.09.27	Fr, 24.09.27
1.29.38	Montage Steigleitern	Mo, 27.09.27	Fr, 01.10.27
1.29.39	Montage Schachtabdeckungen	Mo, 27.09.27	Fr, 08.10.27
1.29.40	VOB Abnahme	Mo, 11.10.27	Fr, 15.10.27
1.29.41	Mangelbeseitigung FW, RD, ILtS	Mo, 18.10.27	Fr, 05.11.27

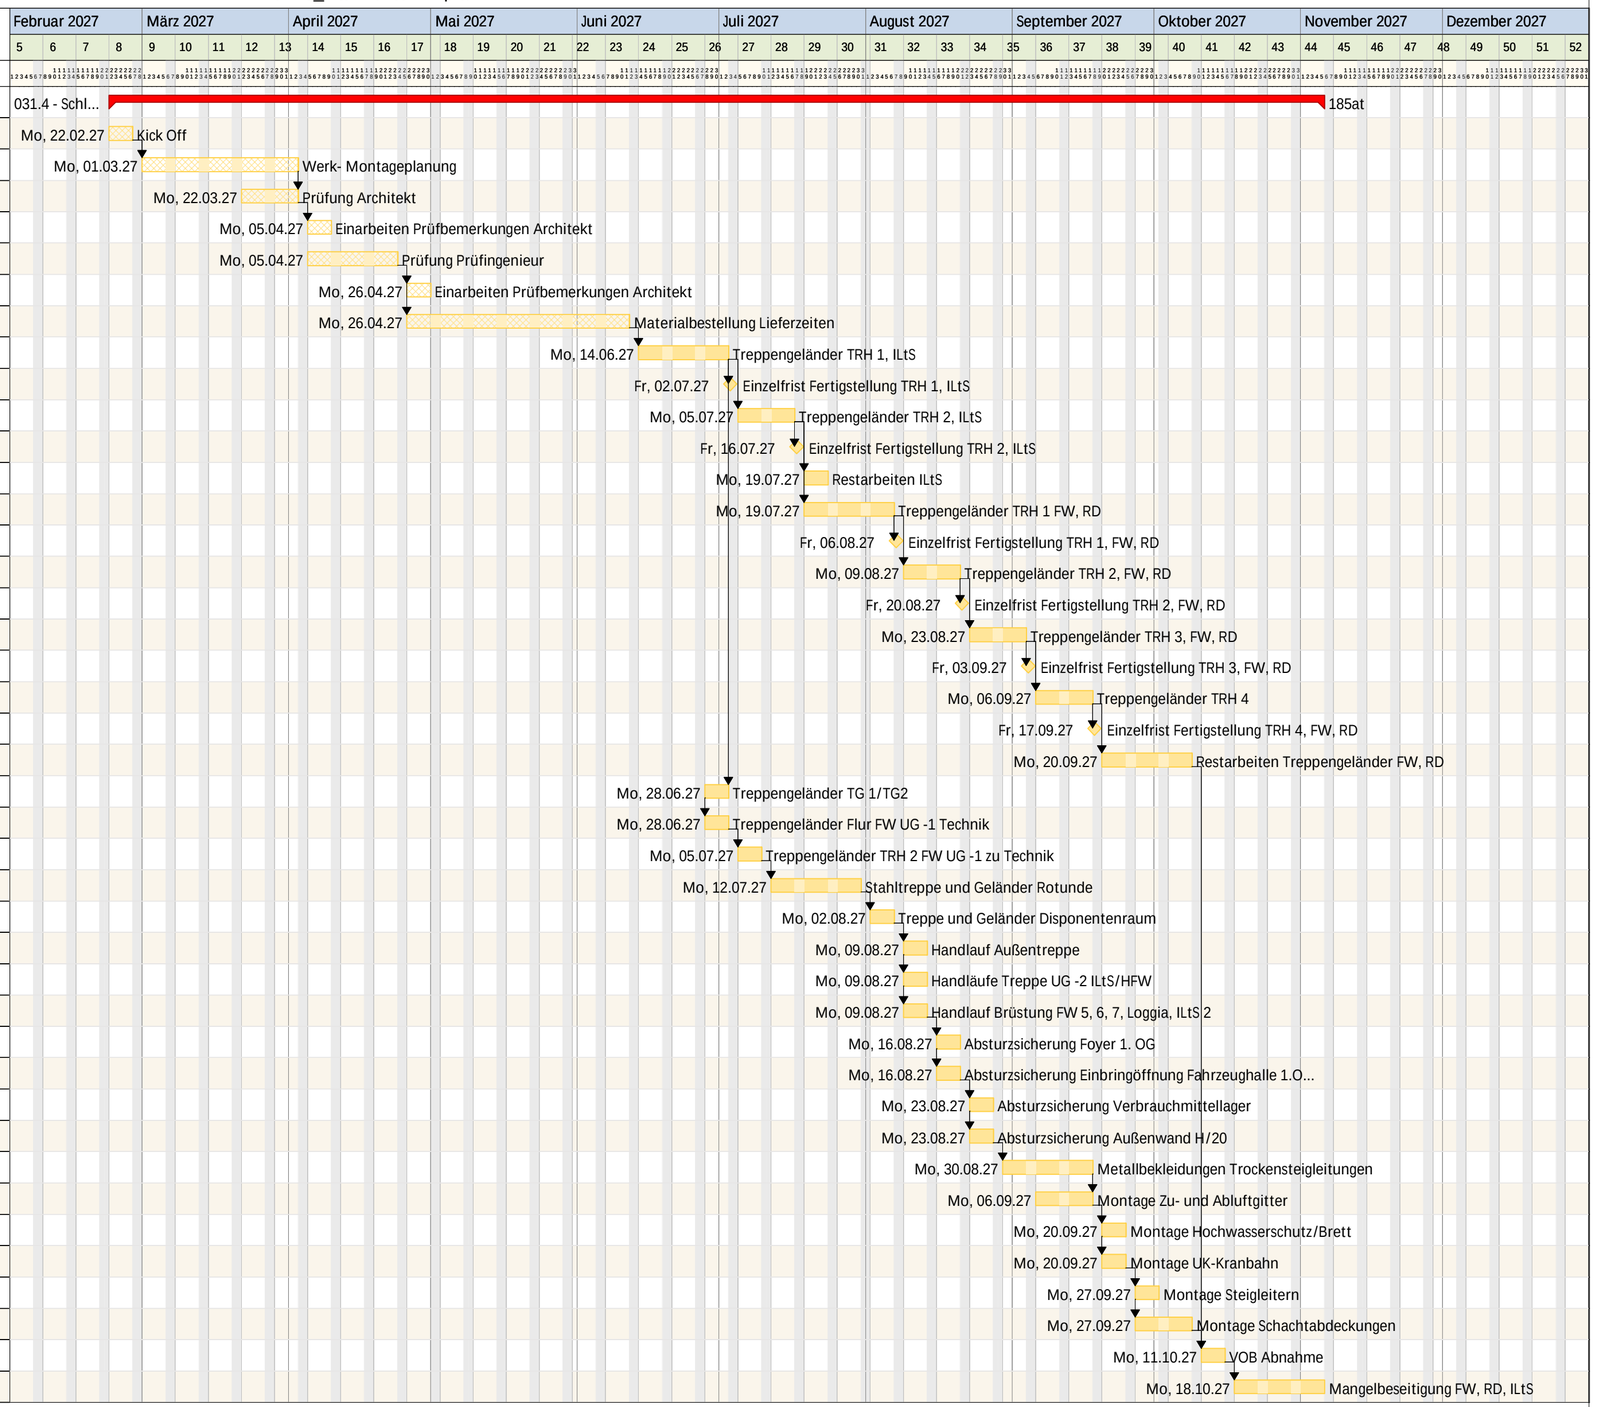

Projektzeitrahmen von Fr, 01.09.23 bis Do, 31.08.28
Kalender: MSProject-Import (eingebettet)
Druckdatum: 02.11.2026 12:33
Filter:

erstellt mit pro-Plan 2024 (24.0.6.0) Seiten-Nr.: PP-24-4044855236 Lizenz für Hardt und Partner, Trier
