Nr.	Vor	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		Ausschreibung Planer + Statiker	30 Tage	Mon 15.06.26	Fre 24.07.26
2		Vergabe an Planer + Statiker	12 Tage	Fre 24.07.26	Mon 10.08.26
3		Stufe 1	111 Tage	Die 11.08.26	Die 12.01.27
4		Soll - Lph.1, Grundlagenermittlung	14 Tage	Die 11.08.26	Fre 28.08.26
5		Ist - Lph.1, Grundlagenermittlung			
6		Soll - Lph.2, Vorplanung	14 Tage	Sam 29.08.26	Mit 16.09.26
7		Ist - Lph.2, Vorplanung			
8		Soll - Lph.3, Entwurfsplanung	21 Tage	Don 17.09.26	Don 15.10.26
9		Ist - Lph.3, Entwurfsplanung			
10		Soll - Lph.4, Genehmigungssplanung	63 Tage	Fre 16.10.26	Die 12.01.27
11		Ist - Lph.4, Genehmigungssplanung			
12		Stufe 2	105 Tage	Fre 13.11.26	Don 08.04.27
13		Soll - Lph.5, Ausführungsplanung + Leistungsverzeichnis	53 Tage	Fre 13.11.26	Die 26.01.27
14		Ist - Lph.5, Ausführungsplanung + Leistungsverzeichnis			
15		Soll - Lph.6, Vorbereitung der Vergabe der Gewerke	21 Tage	Mit 27.01.27	Mit 24.02.27
16		Ist - Lph.6, Vorbereitung der Vergabe der Gewerke			
17		Soll - Lph.7, Mitwirkung bei der Vergabe der Gewerke	7 Tage	Don 25.02.27	Fre 05.03.27
18		Ist - Lph.7, Mitwirkung bei der Vergabe der Gewerke			
19		Beauftragung Gewerke	24 Tage	Mon 08.03.27	Don 08.04.27
20		Stufe 3	255 Tage	Mon 08.03.27	Fre 25.02.28
21		Soll - Lph.8, Objektüberwachung	255 Tage	Mon 08.03.27	Fre 25.02.28
22		Ist - Lph.8, Objektüberwachung			
23		Dokumentation	24 Tage	Mon 28.02.28	Don 30.03.28
24		Soll - Lph.9, Objektbetreuung (Gewährleistungsansprüche)	15 Tage	Mon 23.02.32	Fre 12.03.32
25		Ist - Lph.9, Objektbetreuung			

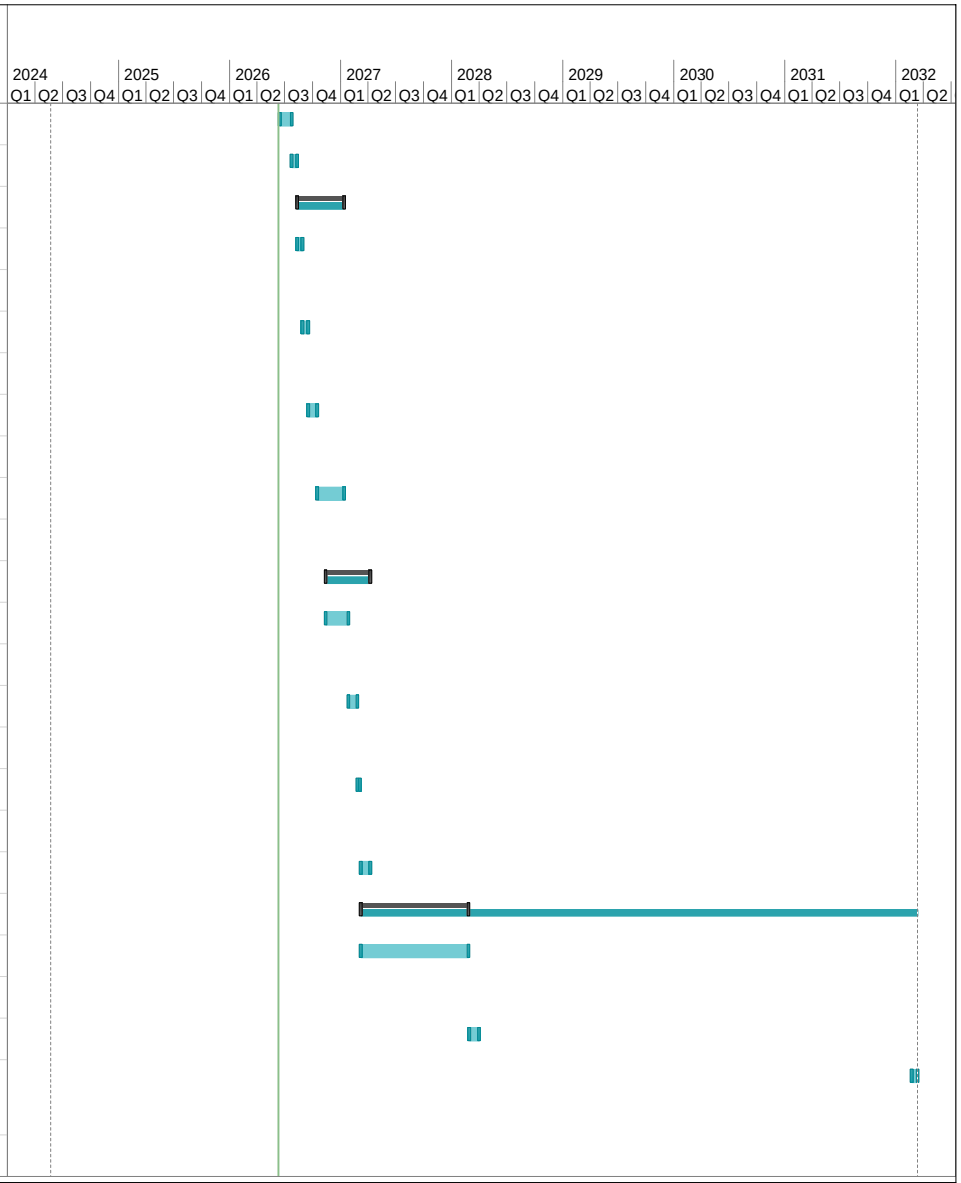

Projekt: 240809_Grobterminpla
Datum: Don 11.06.26

Vorgang	Inaktiver Vorgang	Manueller Sammelrollup	Externer Meilenstein
Unterbrechung	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelvorgang	Stichtag
Meilenstein	Inaktiver Sammelvorgang	Nur Anfang	In Arbeit
Sammelvorgang	Manueller Vorgang	Nur Ende	Manueller Fortschritt
Projektsammelvorgang	Nur Dauer	Externe Vorgänge	
