Datei 02.07.2026 Rahmenterminplan.PPL

Bauzeitenplan

240416_Rahmenterminplan

Pos	Vorgang	Start	Ende
1.16	023.1 - Putz- und Stuckarbeiten, WDVS	Mo, 30.11.26	Fr, 14.05.27
1.16.1	Kick Off	Mo, 30.11.26	Fr, 04.12.26
1.16.2	Vorlaufzeit Materialbestellung	Mo, 07.12.26	Fr, 22.01.27
1.16.3	Entrauchungsschächte WDVS ILtS + FW	Mo, 25.01.27	Fr, 05.02.27
1.16.4	Innenputz geschossübergreifend	Mo, 08.02.27	Fr, 12.03.27
1.16.5	Außenwand UG -1	Mo, 15.03.27	Fr, 26.03.27
1.16.6	Innenputz Schachtwände	Mo, 01.03.27	Fr, 30.04.27
1.16.6.1	Innenputz TRH 1 ILtS	Mo, 01.03.27	Fr, 12.03.27
1.16.6.2	Innenputz TRH 2 ILtS	Mo, 08.03.27	Fr, 19.03.27
1.16.6.3	Restarbeiten ILtS	Mo, 22.03.27	Di, 23.03.27
1.16.6.4	Innenputz TRH 1 FW	Mo, 22.03.27	Fr, 02.04.27
1.16.6.5	Innenputz TRH 2 FW	Mo, 29.03.27	Fr, 09.04.27
1.16.6.6	Innenputz TRH 3 FW	Mo, 05.04.27	Fr, 16.04.27
1.16.6.7	Restarbeiten FW	Mo, 19.04.27	Fr, 30.04.27
1.16.7	VOB-Abnahme	Fr, 30.04.27	Fr, 30.04.27
1.16.8	Mangelbeseitigung FW, RD, ILtS	Mo, 03.05.27	Fr, 14.05.27

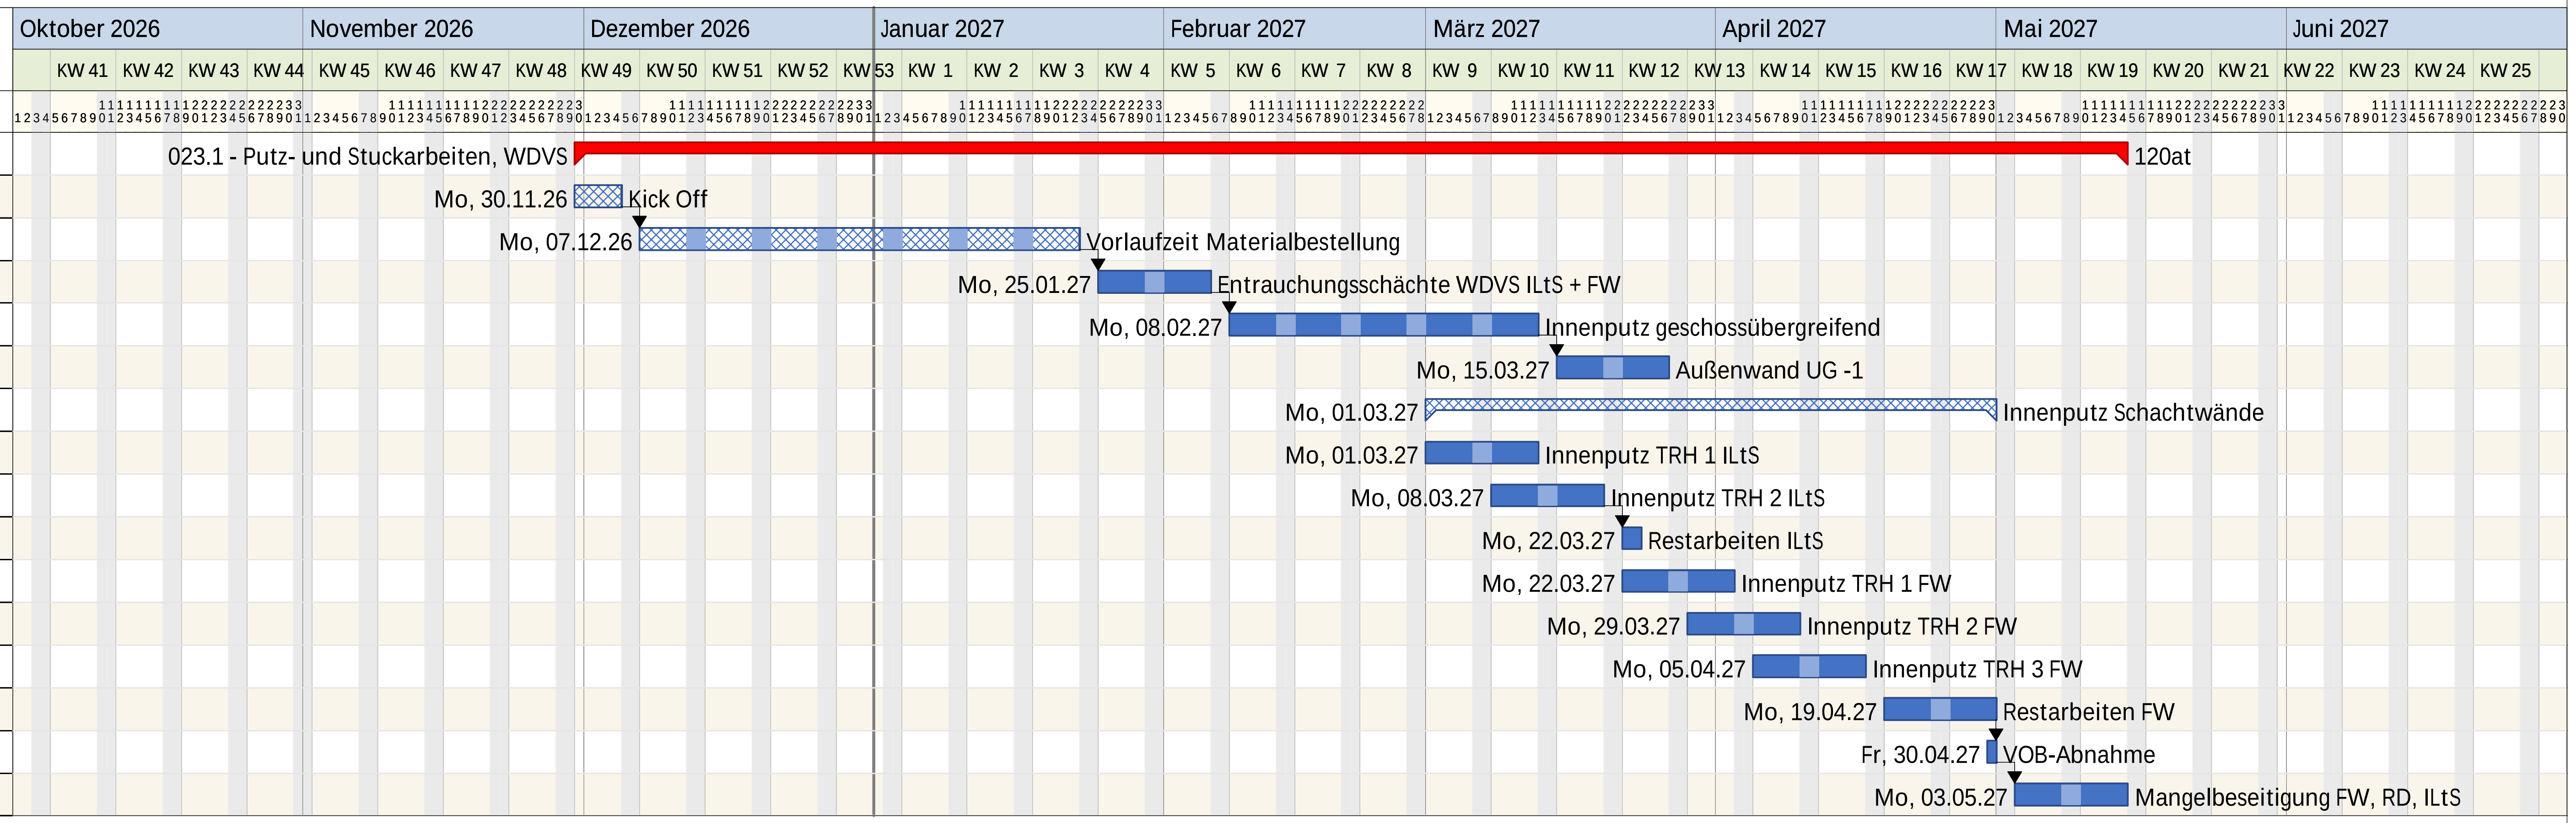

Projektzeitrahmen von Fr, 01.09.23 bis Do, 31.08.28
Kalender: MSProject-Import (eingebettet)
Druckdatum: 15.09.2026 19:35
Filter:
