Containerschule GS Wunderburg

Stand: 16. September 2026

Bauzeitenplan
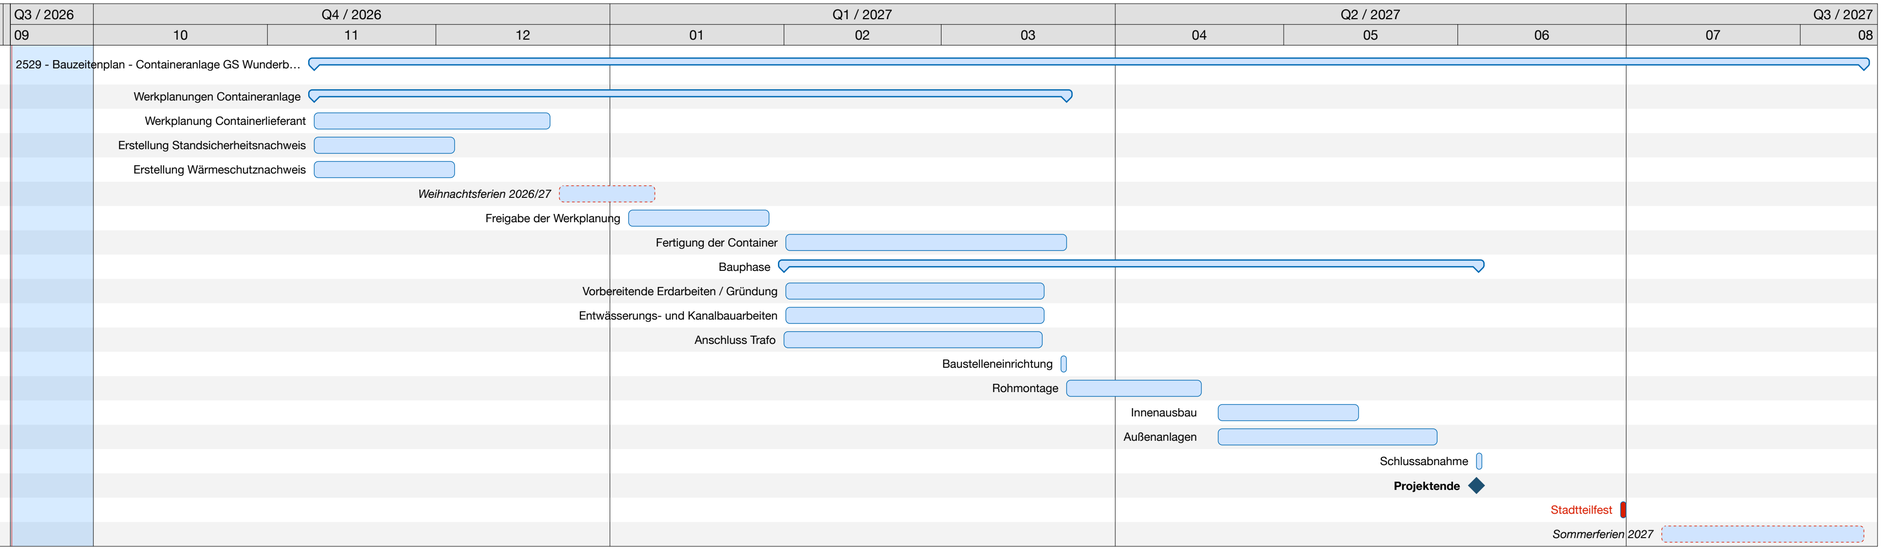
#	Titel	Erwarteter Start	Erwartetes Ende
0	**2529 - Bauzeitenplan - Containeranlage GS Wunderburg**	**09.11.2026**	**12.08.2027**
1	**Werkplanungen Containeranlage**	**09.11.2026**	**23.03.2027**
2	Werkplanung Containerlieferant	09.11.2026	21.12.2026
3	Erstellung Standsicherheitsnachweis	09.11.2026	04.12.2026
4	Erstellung Wärmeschutznachweis	09.11.2026	04.12.2026
5	*Weihnachtsferien 2026/27*	*23.12.2026*	*09.01.2027*
6	Freigabe der Werkplanung	04.01.2027	29.01.2027
7	Fertigung der Container	01.02.2027	23.03.2027
8	**Bauphase**	**01.02.2027**	**04.06.2027**
9	Vorbereitende Erdarbeiten / Gründung	01.02.2027	19.03.2027
10	Entwässerungs- und Kanalbauarbeiten	01.02.2027	19.03.2027
11	Anschluss Trafo	01.02.2027	19.03.2027
12	Baustelleneinrichtung	22.03.2027	22.03.2027
13	Rohmontage	23.03.2027	16.04.2027
14	Innenausbau	19.04.2027	14.05.2027
15	Außenanlagen	19.04.2027	28.05.2027
16	Schlussabnahme	04.06.2027	04.06.2027
17	**Projektende**	**04.06.2027**	**04.06.2027**
18	Stadtteilfest	30.06.2027	30.06.2027
19	Sommerferien 2027	7. Juli 2027	12.08.2027
