Bauzeitenplan

240416_Rahmenterminplan

Pos	Vorgang	Start	Ende
1.30	017.1 - Stahlbau, Nebengebäude, Zäune	Mi, 20.01.27	Fr, 23.07.27
1.30.1	Kick Off	Mi, 20.01.27	Mi, 20.01.27
1.30.2	Aufmaß, technische Bearbeitung, Werkplanung AN	Mi, 20.01.27	Fr, 26.02.27
1.30.3	Prüfung Architekt	Mo, 15.02.27	Fr, 26.02.27
1.30.4	Einarbeiten Prüfbemerkungen	Mo, 01.03.27	Fr, 05.03.27
1.30.5	Prüfung Prüfstatiker	Mo, 08.03.27	Fr, 26.03.27
1.30.6	Einarbeiten Prüfbemerkungen	Mo, 29.03.27	Fr, 02.04.27
1.30.7	Materialbestellung, Lieferzeiten	Mo, 29.03.27	Fr, 07.05.27
1.30.8	Vorleistungen für VE 080.1 (Fundamente etc.)	Mo, 08.02.27	Fr, 19.02.27
1.30.9	Stahlbau Nebengebäude, Dach- und Fassaden	Mo, 10.05.27	Fr, 18.06.27
1.30.10	Zaunanlage EG	Mo, 31.05.27	Fr, 18.06.27
1.30.11	Einhausung Rückkühlgerät EG	Mo, 14.06.27	Fr, 25.06.27
1.30.12	Zaunanlage Flurbereich UG -1	Mo, 21.06.27	Fr, 02.07.27
1.30.13	Lüftungsgitter Technikräume UG -1	Mo, 05.07.27	Fr, 09.07.27
1.30.14	VOB Abnahme	Fr, 09.07.27	Fr, 09.07.27
1.30.15	Mangelbeseitigung	Mo, 12.07.27	Fr, 23.07.27

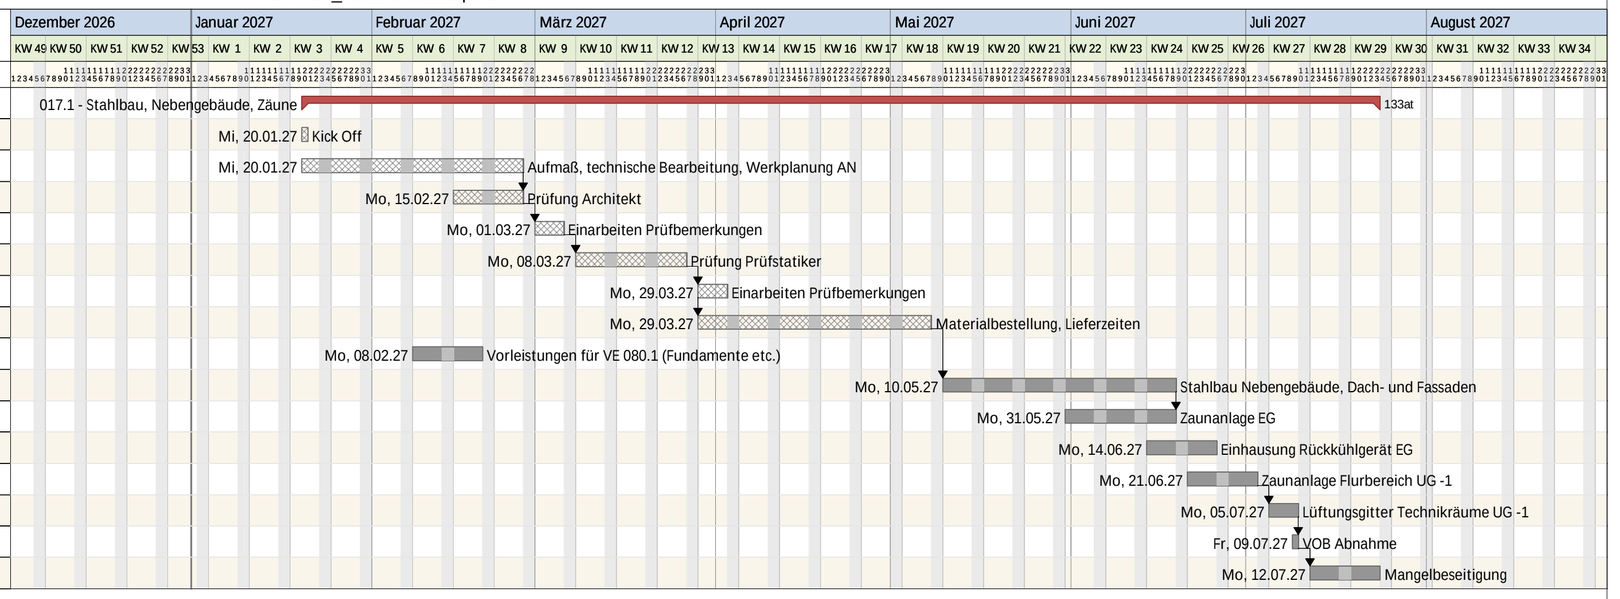

Projektzeitrahmen von Fr, 01.09.23 bis Do, 31.08.28
Kalender: MSProject-Import (eingebettet)
Druckdatum: 23.09.2026 17:19
Filter:

Lizenz für Hardt und Partner, Trier
Serien Nr.: PK-24-4044855288x
erstellt mit pro-Plan 2024 (24.0.0.6)
