
Bauzeitenplan

240416_Rahmenterminplan

Pos	Vorgang	Start	Ende
1.18	024.1 - Fliesen- und Plattenarbeiten (13.10.2026)	Mo, 22.02.27	Fr, 22.10.27
1.18.1	Kick Off	Mo, 22.02.27	Fr, 26.02.27
1.18.2	Bemusterung Fliesen	Mo, 01.03.27	Fr, 19.03.27
1.18.3	Tech. Bearbeitung, Lieferzeiten	Mo, 01.03.27	Fr, 07.05.27
1.18.4	Fliesen-Plattenarbeiten UG -1 FW, RD	Mo, 10.05.27	Fr, 28.05.27
1.18.5	Einzelfrist Fertigstellung UG -1 FW, RD	Fr, 28.05.27	Fr, 28.05.27
1.18.6	Fliesen- Plattenarbeiten EG ILtS	Mo, 24.05.27	Fr, 04.06.27
1.18.7	Einzelfrist Fertigstellung EG ILtS	Fr, 04.06.27	Fr, 04.06.27
1.18.8	Fliesen- Plattenarbeiten 1. OG ILtS	Mo, 31.05.27	Fr, 04.06.27
1.18.9	Einzelfrist Fertigstellung 1. OG ILtS	Fr, 04.06.27	Fr, 04.06.27
1.18.10	Fliesen-Plattenarbeiten 2. OG ILtS	Mo, 07.06.27	Fr, 25.06.27
1.18.11	Einzelfrist Fertigstellung 2. OG ILtS	Fr, 25.06.27	Fr, 25.06.27
1.18.12	Fliesen- Plattenarbeiten 3. OG ILtS	Mo, 21.06.27	Fr, 02.07.27
1.18.13	Einzelfrist Fertigstellung 3. OG ILtS	Fr, 02.07.27	Fr, 02.07.27
1.18.14	Restarbeiten ILtS	Mo, 05.07.27	Fr, 16.07.27
1.18.15	Fliesen- Plattenarbeiten EG FW, RD	Mo, 19.07.27	Fr, 06.08.27
1.18.16	Einzelfrist Fertigstellung EG FW, RD	Fr, 06.08.27	Fr, 06.08.27
1.18.17	Fliesen-Plattenarbeiten 1. OG FW, RD	Mo, 02.08.27	Fr, 06.08.27
1.18.18	Einzelfrist Fertigstellung 1. OG FW, RD	Fr, 06.08.27	Fr, 06.08.27
1.18.19	Fliesen- Plattenarbeiten 2. OG FW, RD	Mo, 09.08.27	Fr, 27.08.27
1.18.20	Einzelfrist Fertigstellung 2. OG FW, RD	Fr, 27.08.27	Fr, 27.08.27
1.18.21	Fliesen- Plattenarbeiten 3.OG FW, RD	Mo, 23.08.27	Fr, 17.09.27
1.18.22	Einzelfrist Fertigstellung 3. OG FW, RD	Fr, 17.09.27	Fr, 17.09.27
1.18.23	Restarbeiten FW, RD, ILtS	Mo, 20.09.27	Fr, 08.10.27
1.18.24	VOB-Abnahme	Fr, 08.10.27	Fr, 08.10.27
1.18.25	Mangelbeseitigung FW, RD, ILtS	Mo, 11.10.27	Fr, 22.10.27

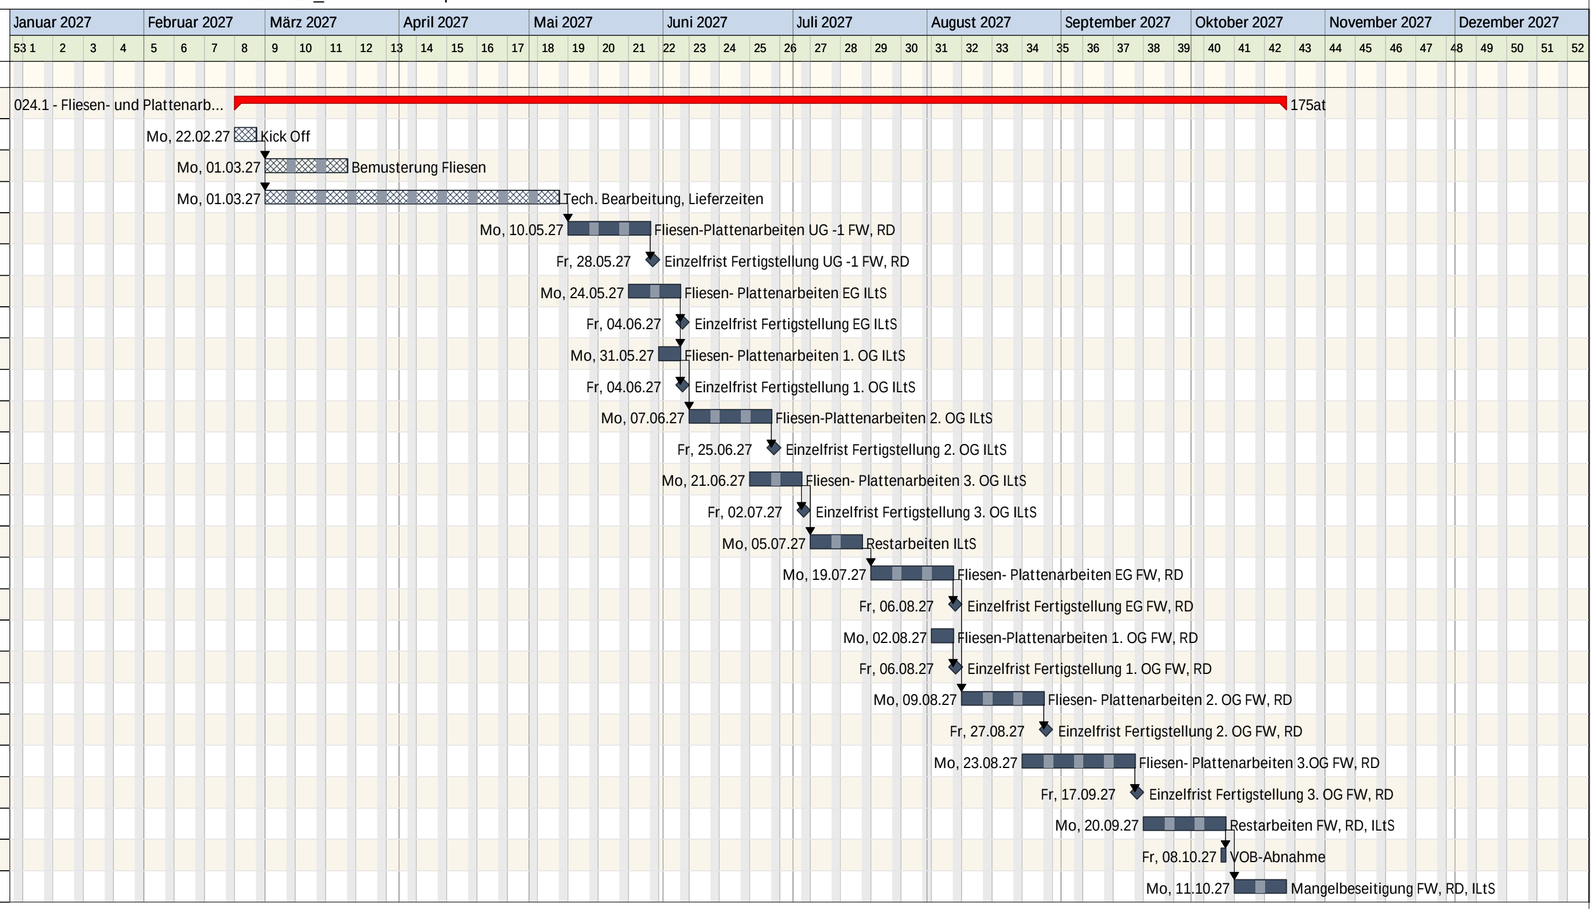

Projektzeitrahmen von Fr, 01.09.23 bis Do, 31.08.28
Kalender: MSProject-Import (eingebettet)
Druckdatum: 01.11.2026 13:41
Filter:

erstellt mit pro:Plan 2024 (24.1.0.6) Serien Nr.: PN-24-45x1448552B6 Lizenz für Hardt und Partner, Trier
